



**Штаб по вопросам реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории ЗАО и ЦАО
города Москвы**

О проведении работ по ремонту системы газоснабжения по МКД в 2022 году силами АО «МОСГАЗ»

Между ФКР Москвы и АО «МОСГАЗ» заключены договора на проведение работ по ремонту системы газоснабжения в 2022 году по МКД в районах Внуково, Дорогомилово, Кунцево, Раменки, Солнцево, Тропарево-Никулино, Фили-Давыдково.

Прошу управе района и управляющей организации оказывать содействие в обеспечении доступа в квартиры для проведения работ.

В случае отказа собственников от проведения работ необходимо:

1. Оформить протокол ОСС или воспрепятствование;
2. УК заключить договор со специализированной организацией на проведение диагностики системы газоснабжения с выпуском заключения о продлении срока службы эксплуатации.

Адресный перечень представлен на сл.слайде

О проведении работ по ремонту системы газоснабжения по МКД в 2022 году силами АО «МОСГАЗ»

№	Район	Адрес по программе	Год постройки	Кол-во квартир	Кол-во этажей	Срок проектирования	Срок СМР
1	Внуково	Рассказовская ул. 20	1972	84	12	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
2	Дорогомилово	Кутузовский просп. 21	1953	100	12	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
3		Кутузовский просп. 3	1975	85	10	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
4		Кутузовский просп. 41	1948	189	9	21.11.21-30.04.22	01.05.22-31.08.22
5	Кунцево	Ельнинская ул. 19	1965	96	12	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
6		Бобруйская ул. 14 к.2	1973	98	14	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
7		Ельнинская ул. 5	1976	127	12	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
8		Ивана Франко ул. 30 к.1	1961	60	5	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
9		Новорублевская 2-я ул. 8	1970	64	5	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
10		Обводное шоссе 8	1967	80	5	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
11		Обводное шоссе 9	1967	160	5	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
12	Раменки	Винницкая ул. 17	1970	215	9	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
13		Мосфильмовский 2-й пер. 21	1970	208	17	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
14		Винницкая ул. 13	1971	143	12	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
15		Мичуринский просп. 8 к.1	1961	62	9	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
16	Солнцево	50 лет Октября ул. 5 к.2	1973	143	9	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
17	Тропарево-Никулино	26 Бакинских Комиссаров ул. 12 к.4	1970	98	14	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
18		Вернадского просп. 117	1968	340	9	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
19		26 Бакинских Комиссаров ул. 10 к.1	1970	139	12	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
20		26 Бакинских Комиссаров ул. 2 к.1	1971	143	12	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
21		26 Бакинских Комиссаров ул. 4 к.1	1971	95	16	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
22		26 Бакинских Комиссаров ул. 4 к.3	1970	251	9	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
23		26 Бакинских Комиссаров ул. 6 к.1	1971	143	12	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
24		26 Бакинских Комиссаров ул. 7 к.1	1970	108	9	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
25		26 Бакинских Комиссаров ул. 7 к.3	1970	108	9	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
26		26 Бакинских Комиссаров ул. 7 к.5	1970	108	9	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
27		26 Бакинских Комиссаров ул. 1 к.1	1968	143	9	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
28		26 Бакинских Комиссаров ул. 4 к.4	1970	107	9	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
29		26 Бакинских Комиссаров ул. 7 к.4	1970	100	9	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22
30		Фили-Давыдково	Филевская М. ул. 14 к.2	1967	67	9	21.12.21-20.05.22
31	Пивченкова ул. 3 к.2		1965	72	9	21.12.21-20.05.22	01.05.22-30.09.22

О постановке на учет подъемных механизмов в Ростехнадзоре

№	ГБУ	Факт	Дата сдачи полного пакета в Ростехнадзор (либо плановая если не сдано)	Зарегистрированы (планируемая дата)
1	ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВНУКОВО»	8	24.11.2021	15.12.2021
2	ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ДОРОГОМИЛОВО»	8		Да
3	ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КРЫЛАТСКОЕ»	8	16.11.2021	28.11.2021
4	ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КУНЦЕВО»	8		Да
5	ГБУ «ЖИЛИЩНИК МОЖАЙСКОГО РАЙОНА»	8	18.11.2021	10.12.2021
6	ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО»	13		Да
7	ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ»	8		Да
8	ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО»	8		Да
9	ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА РАМЕНКИ»	8		Да
10	ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОЛНЦЕВО»	8		Да
11	ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО»	8		Да
12	ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ФИЛЕВСКИЙ ПАРК»	8		Да
13	ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ФИЛИ-ДАВЫДКОВО»	8		Да

Районам доложить о ходе постановки на учет закупленных люлек в Ростехнадзоре

Разработка проектно-сметной документации (прохождение МГЭ с 11.11.2021)

№	ГБУ	Адрес многоквартирного дома	Сдача документов на аванс на МГЭ	Статус ТЗК 01.09.2021-10.10.2021	Статус ПСД 11.10.2021-10.11.2021	Прохождение экспертизы 11.11.2021-20.12.2021	Дата начала экспертизы	Плановая дата утверждения своенного заключения	Плановая дата выпуска заключения	Заключение МГЭ
1	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВНУКОВО"	Рассказовская ул. 20		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38543-1/5 от 19.11.2021 На рассмотрении				
2		Рассказовская ул. 30		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38542-1/5 от 19.11.2021 На рассмотрении				
3		Спортивная ул.(Внуково) 3Б		Согласовано ТЗК	Выданы замечания					
4	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ДОРОГОМИЛОВО"	Советская ул. (Рублево) 15		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ					
5	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КРЫЛАТСКОЕ"	Рублевское шоссе 109 к.6	сдали 23.11.2021	Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38498-1/5 от 16.11.2021 На рассмотрении				
6	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КУНЦЕВО"	Новорублевская 2-я ул. 8		Выданы замечания						
7		Тимошенко Маршала ул. 24		Согласовано ТЗК	Загружено Г П					
8		Тимошенко Маршала ул. 9		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38515-1/5 от 18.11.2021 На рассмотрении				
9	ГБУ "ЖИЛИЩНИК МОЖАЙСКОГО РАЙОНА"	Гришина ул. 14		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38490-1/5 от 16.11.2021 Приостановка рассмотрения				
10	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ"	Матвеевская ул. 3		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38583-1/5 от 22.11.2021 На рассмотрении				
11		Матвеевская ул. 7		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38405-1/5 от 12.11.2021 На рассмотрении				
12	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО"	Ленинский просп. 130 к.1		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ					
13	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОЛНЦЕВО"	Попутная ул. 1 к.1		Согласовано ТЗК	Выданы замечания					
14	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ФИЛИ-ДАВЫДКОВО"	Кастанавская ул. 42 к.2	не требуется	Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/37883-1/5 от 01.10.2021 Пройдена	25.10.2021	18.11.2021	23.11.2021	Положительное
15		Пивченкова ул. 1 к.3		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38277-1/5 от 29.10.2021 В работе	11.11.2021	03.12.2021	08.12.2021	
16		Пивченкова ул. 3 к.2		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38552-1/5 от 19.11.2021 На рассмотрении				

Разработка проектно-сметной документации (прохождение МГЭ с 21.11.2021)

№	ГБУ	Адрес многоквартирного дома	Сдача документов на аванс на МГЭ	Статус ТЗК 11.09.2021-20.10.2021	Статус ПСД 21.10.2021-20.11.2021	Прохождение экспертизы 21.11.2021-31.12.2021	Дата начала экспертизы
1	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВНУКОВО"	Рассказовская ул. 22		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ		
2		Рассказовская ул. 24		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ		
3		Рассказовская ул. 28		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ		
4	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ДОРОГОМИЛОВО"	Обводное шоссе 5		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38608-1/5 от 23.11.2021 На рассмотрении	
5		Обводное шоссе 9	сдали 23.11.2021	Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38609-1/5 от 23.11.2021 На рассмотрении	
6		Советская ул. (Рублево) 13		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ		
7	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КРЫЛАТСКОЕ"	Крылатские Холмы ул. 35 к.2		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ		
8	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КУНЦЕВО"	Новорублевская 2-я ул. 15 к.1		Согласовано ТЗК	Загружено ГП		
9		Новорублевская ул. 11		Загружено ГП			
10		Обводное шоссе 10		Выданы замечания			
11	ГБУ "ЖИЛИЩНИК МОЖАЙСКОГО РАЙОНА"	Гришина ул. 10 к.2		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ		
12		Загорского пр. 7 к.2		Загружено ГП			
13	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО"	Винницкая ул. 17		Согласовано ТЗК	Загружено ГП		
14		Винницкая ул. 3		Согласовано ТЗК	Загружено ГП		
15		Лазенки 6-я ул. 32		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38625-1/5 от 23.11.2021 На рассмотрении	
16		Лазенки 6-я ул. 36		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38626-1/5 от 23.11.2021 На рассмотрении	
17	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ"	Матвеевская ул. 1 к.1		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38398-1/5 от 12.11.2021 На рассмотрении	
18		Озерная ул. 15		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ		
19		Озерная ул. 17		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38449-1/5 от 14.11.2021 На рассмотрении	

Разработка проектно-сметной документации (прохождение МГЭ с 21.11.2021)

	ГБУ	Адрес многоквартирного дома	Сдача документов на аванс на МГЭ	Статус ТЗК 11.09.2021-20.10.2021	Статус ПСД 21.10.2021-20.11.2021	Прохождение экспертизы 21.11.2021-31.12.2021	Дата начала экспертизы	Плановая дата утверждения сводного заключения	Плановая дата выпуска заключения
20	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО"	Мичуринский просп. 8 к.1		Согласовано ТЗК	Загружено ГП				
21		Удальцова ул. 3 к.3		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38591-1/5 от 22.11.2021 На рассмотрении			
22		Удальцова ул. 3 к.4		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38599-1/5 от 22.11.2021 На рассмотрении			
23		Удальцова ул. 3 к.6		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38600-1/5 от 22.11.2021 На рассмотрении			
24		Удальцова ул. 3 к.7		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38605-1/5 от 22.11.2021 На рассмотрении			
25		Удальцова ул. 3 к.8		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38594-1/5 от 22.11.2021 На рассмотрении			
26	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА РАМЕНКИ"	Мичуринский просп. 54 к.2	сдали 24.11.2021	Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38592-1/5 от 22.11.2021 На рассмотрении			
27		Мосфильмовская ул. 41 к.1		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ				
28	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОЛНЦЕВО"	50 лет Октября ул. 1 к.1		Согласовано ТЗК	Согласовано ПСД				
29		50 лет Октября ул. 29		Согласовано ТЗК	Выданы замечания				
30		Боровский пр. 24		Согласовано ТЗК	Загружено ГП				
31		Матросова ул. 6		Согласовано ТЗК	Выданы замечания				
32		Попутная ул. 5		Согласовано ТЗК	Выданы замечания				
33	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО"	26 Бакинских Комиссаров ул. 1 к.1		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ				
34		26 Бакинских Комиссаров ул. 1 к.2		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ				
35		26 Бакинских Комиссаров ул. 1 к.3		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38545-1/5 от 17.11.2021 Приостановка рассмотрения			
36	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ФИЛЕВСКИЙ ПАРК"	Филевский бульв. 7 к.1		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ				
37	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ФИЛИ-ДАВЫДКОВО"	Инициативная ул. 16 к.1		Согласовано ТЗК	Согласовано ПСД				
38		Кастанаевская ул. 60		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38453-1/5 от 15.11.2021 В работе	22.11.2021	14.12.2021	17.12.2021
39		Филевская Б. ул. 39 к.2		Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38508-1/5 от 17.11.2021 Приостановка рассмотрения			

Разработка проектно-сметной документации (согласование ПСД до 30.11.2021)

№	ГБУ	Адрес многоквартирного дома	Статус ТЗК 21.09.2021 - 31.10.2021	Статус ПСД 01.11.2021 - 30.11.2021	Прохождение экспертизы 01.12.2021 - 31.01.2022
1	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ДОРОГОМИЛОВО"	Киевская ул. 20	Согласовано ТЗК	Загружено ГП	
2	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КРЫЛАТСКОЕ"	Новорублевская 2-я ул. 4	Согласовано ТЗК		
3	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КУНЦЕВО"	Ельнинская ул. 11 к.2	Согласовано ТЗК		
4		Ельнинская ул. 19	Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	
5	ГБУ "ЖИЛИЩНИК МОЖАЙСКОГО РАЙОНА"	Витебская ул. 8 к.2	Согласовано ТЗК		
6	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО"	50 лет Октября ул. 5 к.2	Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	
7	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ"	Веерная ул. 7 к.1	Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38445-1/5 от 15.11.2021 Приостановка рассмотрения
8		Нежинская ул. 25	Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38614-1/5 от 23.11.2021 На рассмотрении
9		Озерная ул. 25	Согласовано ТЗК		
10		Озерная ул. 27	Согласовано ТЗК		
11		Очаковская Б. ул. 15	Согласовано ТЗК	Согласована загрузка в МГЭ	МГЭ/38430-1/5 от 14.11.2021 На рассмотрении
12	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ТРОПАРЕВОНИКУЛИНО"	26 Бакинских Комиссаров ул. 7 к.4	Согласовано ТЗК	Загружено ГП	
13		26 Бакинских Комиссаров ул. 7 к.5	Согласовано ТЗК	Загружено ГП	
14		Вернадского просп. 89 к.2	Загружено ГП		
15	ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ФИЛЕВСКИЙ ПАРК"	Береговой пр. 9 к.5	Согласовано ТЗК		
16		Боженко ул. 8 к.4	Согласовано ТЗК		

О ходе начала работ с 11.08.2021 по МКД (переходящие на 2022)

ГБУ	Адрес	Характеристики МКД	электроснабжение	ХВС (магистрала)	ГВС (магистрала)	ВО (стояки)	ВО (магистрала)	ЦО (стояки)	подвальные помещения	крыша	фасад	мусоропровод	МОП	внутренний водосток
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ДОРОГОМИЛОВО»	Дорогомиловская Б. ул. 5	8 Подъездов 8 Этажей		80	80		80	0	0			75	0	
				80	80		100	0	0			95	0	
				11.08.2021	11.08.2021		11.08.2021	21.04.2022	01.05.2022			11.08.2021	11.06.2022	
				20.11.2021	20.11.2021		20.11.2021	20.08.2022	10.09.2022			20.11.2021	31.10.2022	
ГБУ «ЖИЛИЩНИК МОЖАЙСКОГО РАЙОНА»	Фрунзенская 3-я ул. 10	4 подъезда 9 этажей	20			0	95		0	0	0	95	0	0
			60				100					100		
			11.08.2021			21.04.2022	11.08.2021		01.05.2022	11.04.2022	11.04.2022	11.08.2021	11.06.2022	11.04.2022
			30.11.2021			20.08.2022	30.11.2021		10.09.2022	10.09.2022	10.09.2022	30.11.2021	31.10.2022	10.09.2022

ГБУ	Адрес	Вид работ(ФЭУ)	СТАТУС КС БАРС	Дата изменения статуса	Статус документов на оплату	Дата согласования ПТУ СК /изменения статуса
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ДОРОГОМИЛОВО»	Дорогомиловская Б. ул. 5	КАН-Магистрала	Возвращено подрядчику	27.10.2021		
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ДОРОГОМИЛОВО»	Дорогомиловская Б. ул. 5	ГВС-Магистрала	Возвращено подрядчику	27.10.2021		
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ДОРОГОМИЛОВО»	Дорогомиловская Б. ул. 5	ХВС-Магистрала	Возвращено подрядчику	27.10.2021		
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ДОРОГОМИЛОВО»	Дорогомиловская Б. ул. 5	Мусоропровод	Передано в ТУ от подрядчика	22.11.2021		
ГБУ «ЖИЛИЩНИК МОЖАЙСКОГО РАЙОНА»	Фрунзенская 3-я ул. 10	Электрика				
ГБУ «ЖИЛИЩНИК МОЖАЙСКОГО РАЙОНА»	Фрунзенская 3-я ул. 10	КАН-Магистрала	Согласовано ФЭУ	26.10.2021	Назначена комиссия ТУ	27.10.2021
ГБУ «ЖИЛИЩНИК МОЖАЙСКОГО РАЙОНА»	Фрунзенская 3-я ул. 10	Мусоропровод	Согласовано ФЭУ	26.10.2021	Назначена комиссия ТУ	27.10.2021



Системы со сдачей до 19.11.2021

ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»


ул. Б.Дорогомиловская , д. 5

12 человек на объекте. Магистрالی ХВС/ГВС: осталась изоляция. Мусоропровод: Идет уборка, осталась организация электрики



Фрунзенская 3-я ул. 10

Электрика: монтаж стояков, замена светильников в МОП.

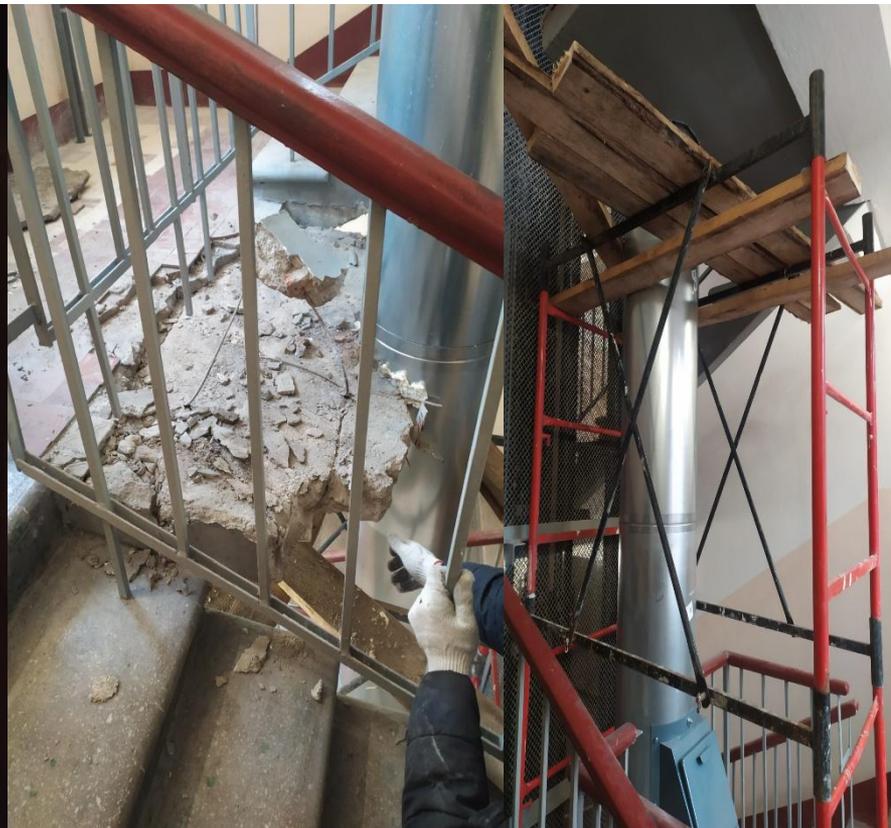

О ходе производства работ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ВНУКОВО»

Адрес	Характеристики МКД	электроснабжение	ХВС (стояки)	ХВС (магистрал и)	ГВС (стояки)	ГВС (магистрал и)	ВО (магистрал и)	ЦО (стояки)	ЦО (магистрал и)	подвальные помещения	крыша	фасад	мусоропровод	МОП	внутренний водосток	пожарный водопровод
Рейсовая 2-я ул. 25Б	18 этажей 4 подъезда 256 квартир	95	95	Завершена (оплачена)	95	Завершена (оплачена)	80	Завершена (оплачена)	60	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)					
		100	117/117							85		75				
		21.04.2021	21.04.2021							11.05.2021		01.05.2021				
		10.08.2021	10.09.2021							20.09.2021		20.10.2021				

Адрес	Вид работ(ФЭУ)	СТАТУС КС БАРС	Дата изменения статуса	Статус документов на оплату	Дата согласования ПТУ СК /изменения статуса
Рейсовая 2-я ул. 25Б	Электрика	Проверено СК	03.11.2021	Проверено СК	10.11.2021
Рейсовая 2-я ул. 25Б	ХВС-Стояки	Проверено СК	17.11.2021	Проверено СК	17.11.2021
Рейсовая 2-я ул. 25Б	Подвал	Проверено СК	17.11.2021	Проверено СК	17.11.2021
Рейсовая 2-я ул. 25Б	Подъезд	Согласовано ИТН	24.11.2021		
Рейсовая 2-я ул. 25Б	Фасад	Согласовано ИТН	24.11.2021		

Району доложить о ходе сдачи второй КС на доп. объемы по Рейсовой 2-ой ул. 25Б



Системы со сдачей до 19.11.2021

ГБУ «Жилищник района Внуково»

ул. 2-я Рейсовая, д. 25Б

15 человек на объекте.

ХВС(м); ГВС(м); ЦО (м): Осталась изоляция в подвале.

МОП: Идут малярные работы и укладка плитки в квартирных и лифтовых холлах 1 и 2 подъездов, демонтаж плитки в 3м. Остались малярные работы, замена плитки и дверей в 3 и 4 подъездах, окраска пожарных лестниц во всех подъездах

Пожарный водопровод: остались монтаж и комплектация щитов.

Фасад: остались цоколь и замена входных дверей

Подвал: осталась стяжка пола в половине подвала



О выполнении ГБУ «Жилищник района Внуково» работ по ремонту фасада по адресу Б. Внуковская, д.17

6 рабочих на объекте. Идет монтаж откосов.



О ходе производства работ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КРЫЛАТСКОЕ»

Адрес	Характеристики МКД	электроснабжение	ХВС (стояки)	ХВС (магистрал и)	ГВС (магистрал и)	ВО (стояки)	ВО (магистрал и)	ЦО (стояки)	ЦО (магистрал и)	подвальные помещения	крыша	фасад	мусоропровод	МОП	внутренний водосток
Крылатские Холмы ул. 27 к.3	3 Подъезда 17 Этажей			Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)		Завершена (оплачена)		Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	95			
												90			
												Завершена (оплачена)			
Филевская Б. ул. 35	1 Подъезд 12 Этажей												Завершена (оплачена)	70	Завершена (оплачена)
														70	
														01.07.2021	
														10.12.2021	

Адрес	Вид работ(ФЭУ)	СТАТУС КС БАРС	Дата изменения статуса
Филевская Б. ул. 35	Подъезд	Возвращено подрядчику	18.11.2021



Системы со сдачей до 19.11.2021

ГБУ «Жилищник района Крылатское»


Крылатские Холмы ул., д. 27 корп.3

Крыша: работы завершены.

Фасад: ремонту балконов

На момент обхода на объекте работает 7 человек.

8 люлек, 8 в работе

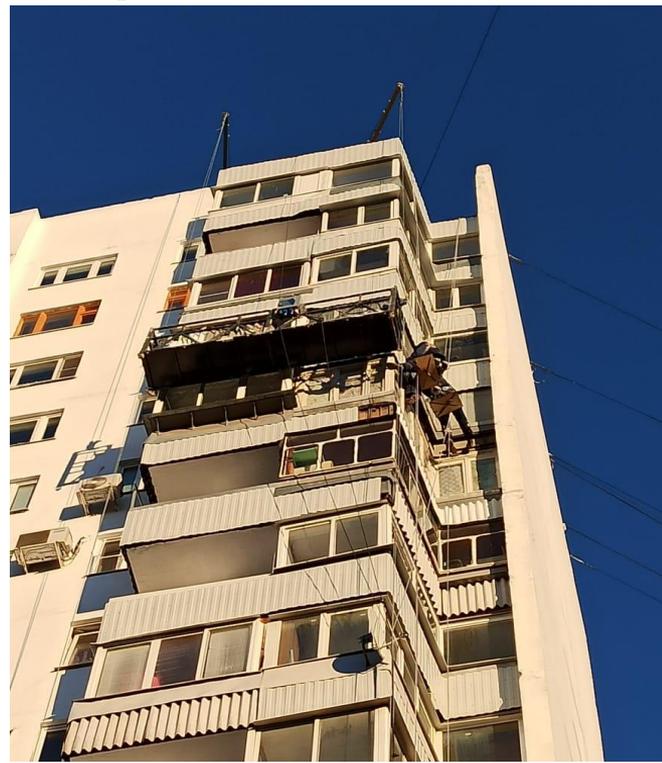

ГБУ «Жилищник района Крылатское»

Большая Филевская ул., д. 35

МОП: укладка напольной плитки, ремонт стен
На момент обхода на объекте работает 8 человек.



О ходе производства работ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КУНЦЕВО»

Адрес	Характеристик и МКД	электроснабжение	ХВС (стояки)	ХВС (магистраль)	ГВС (стояки)	ГВС (магистраль)	ВО (магистраль)	ЦО (стояки)	ЦО (магистраль)	подвальные помещения	крыша	фасад	мусоропровод	МОП	ДУ и ППА	пожарный водопровод		
Арбат ул. 18/1 с.2	2 Подъезда 4 Этажа	95		Исключено		Исключено	Исключено		Исключено		95	95		60				
		100									95	100		40				
		15.04.2021									01.05.2021	01.05.2021		01.06.2021				
		03.06.2021									10.09.2021	10.09.2021		20.12.2021				
Екатерины Будановой ул. 12	3 Подъезда 5 Этажей 70 квартир		исключение	Завершена (оплачена)			Завершена (оплачена)	исключение	Завершена (оплачена)	95		Завершена (оплачена)						
										100								
										01.05.2021							11.02.2021	11.02.2021
										20.08.2021							10.06.2021	10.06.2021
Партизанская ул. 33 к.1	4 Подъезда 5 Этажей 80 квартир	Завершена (оплачена)		Завершена (оплачена)		Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Исключено	Завершена (оплачена)	95	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)		95				
										100				90				
										01.05.2021				11.05.2021			11.05.2021	
										20.08.2021				20.09.2021			20.09.2021	
Рублевское шоссе 93 к.3	1 Подъезд 9 Этажей 72 квартиры		Завершена (оплачена)	95	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)		95				70				
				100						100				100			100	
				11.04.2021						11.05.2021				11.05.2021			01.05.2021	
				20.07.2021						19.09.2021				20.09.2021			20.10.2021	
Тимошенко Маршала ул. 26	14 этажей 1 подъезд 98 квартир	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	75	60	95	95		
		100	65/65	100	65/65	100	100	65/65	100	100	100	100	100	100	65	100	100	
		11.04.2021	11.04.2021	11.04.2021	11.04.2021	11.04.2021	11.04.2021	11.04.2021	11.04.2021	11.05.2021	11.04.2021	11.04.2021	11.04.2021	11.04.2021	01.05.2021	11.04.2021	11.04.2021	
		10.08.2021	19.09.2021	20.07.2021	19.09.2021	20.07.2021	20.07.2021	19.09.2021	19.09.2021	20.09.2021	19.09.2021	29.09.2021	10.08.2021	10.08.2021	20.10.2021	10.08.2021	10.08.2021	
Тимошенко Маршала ул. 28	14 этажей 1 подъезд 98 квартир	95	95	95	95	95	95		95	95	95	95	80	60	95	95		
		100	46/46	100	46/46	100	100		100	100	100	100	100	100	70	100	100	
		11.04.2021	11.04.2021	11.04.2021	11.04.2021	11.04.2021	11.04.2021		11.04.2021	11.05.2021	11.04.2021	11.04.2021	11.04.2021	11.04.2021	01.05.2021	11.04.2021	11.04.2021	
		10.08.2021	19.09.2021	20.07.2021	19.09.2021	20.07.2021	20.07.2021		19.09.2021	20.09.2021	19.09.2021	29.09.2021	29.09.2021	10.08.2021	20.10.2021	10.08.2021	10.08.2021	

Району быть готовым доложить по каждой системе о датах и этапах приемки выполненных работ (дата назначения первой и второй комиссии, дата отправки вызова в МЖИ и тп.)

Району доложить о ходе сдачи второй КС на доп. Объемы по Рублевскому шоссе 93 к3



Системы со сдачей до 19.11.2021

О ходе производства работ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА КУНЦЕВО»

Адрес	Вид работ(ФЭУ)	СТАТУС КС БАРС	Дата изменения статуса	Статус документов на оплату	Дата согласования ПТУ СК /изменения статуса
Арбат ул. 18/1 с.2	Электрика	Комиссия	27.10.2021	Назначена комиссия ТУ	27.10.2021
Арбат ул. 18/1 с.2	Кровля	Согласовано ФЭУ	18.11.2021	Проверено ПТУ СК	18.11.2021
Арбат ул. 18/1 с.2	Подъезд				
Арбат ул. 18/1 с.2	Фасад	Проверено СК	12.11.2021	Назначена комиссия ТУ	27.10.2021
Партизанская ул. 33 к.1	Подвал	Проверено ФЭУ	19.11.2021	Ошибка оформления	21.09.2021
Партизанская ул. 33 к.1	Подъезд	Возвращено подрядчику	18.11.2021		
Екатерины Будановой ул. 12	Подвал	Проверено СК	20.10.2021	Проверено ПТУ СК	12.10.2021
Рублевское шоссе 93 к.3	ЦО-Магистралы	Согласовано ФЭУ	27.10.2021	Ошибка оформления	15.11.2021
Рублевское шоссе 93 к.3	Подвал	Проверено СК	23.11.2021	Проверено СК	23.11.2021
Рублевское шоссе 93 к.3	Подъезд	Возвращено подрядчику	18.11.2021		
Тимошенко Маршала ул. 26	ПШАИДУ	Согласовано ФЭУ	27.08.2021	Проверено ПТУ СК	27.08.2021
Тимошенко Маршала ул. 26	Электрика	Согласовано ФЭУ	28.09.2021	Проверено ПТУ СК	28.09.2021
Тимошенко Маршала ул. 26	КАН-Магистралы	Согласовано ФЭУ	17.08.2021	Проверено ПТУ СК	17.08.2021
Тимошенко Маршала ул. 26	ГВС-Магистралы	Согласовано ФЭУ	19.08.2021	Назначена комиссия ТУ	27.08.2021
Тимошенко Маршала ул. 26	ГВС-Стояки	Согласовано ФЭУ	01.09.2021	Проверено ПТУ СК	01.09.2021
Тимошенко Маршала ул. 26	ЦО-Магистралы	Согласовано ФЭУ	02.09.2021	Проверено ПТУ СК	02.09.2021
Тимошенко Маршала ул. 26	ЦО-Стояки	Согласовано ФЭУ	08.09.2021	Проверено ПТУ СК	08.09.2021
Тимошенко Маршала ул. 26	ХВС-Магистралы	Согласовано ФЭУ	17.08.2021	Проверено ПТУ СК	17.08.2021
Тимошенко Маршала ул. 26	ХВС-Стояки	Согласовано ФЭУ	01.09.2021	Проверено ПТУ СК	01.09.2021
Тимошенко Маршала ул. 26	Мусоропровод	Согласовано ФЭУ	10.09.2021	Проверено ПТУ СК	10.09.2021
Тимошенко Маршала ул. 26	Кровля	Согласовано ФЭУ	01.11.2021	Проверено ПТУ СК	01.11.2021
Тимошенко Маршала ул. 26	Подвал	Согласовано ФЭУ	08.10.2021	Проверено ПТУ СК	08.10.2021
Тимошенко Маршала ул. 26	Подъезд				
Тимошенко Маршала ул. 26	Пож.водопровод	Согласовано ФЭУ	23.09.2021	Проверено ПТУ СК	23.09.2021
Тимошенко Маршала ул. 26	Фасад	Передано в ТУ от подрядчика	22.11.2021		
Тимошенко Маршала ул. 28	ПШАИДУ	Согласовано ФЭУ	16.09.2021	Проверено ПТУ СК	16.09.2021
Тимошенко Маршала ул. 28	Электрика	Согласовано ФЭУ	28.09.2021	Проверено ПТУ СК	28.09.2021
Тимошенко Маршала ул. 28	КАН-Магистралы	Согласовано ФЭУ	16.08.2021	Проверено ПТУ СК	16.08.2021
Тимошенко Маршала ул. 28	ГВС-Магистралы	Согласовано ФЭУ	16.08.2021	Проверено ПТУ СК	16.08.2021
Тимошенко Маршала ул. 28	ГВС-Стояки	Согласовано ФЭУ	21.09.2021	Проверено ПТУ СК	21.09.2021
Тимошенко Маршала ул. 28	ЦО-Магистралы	Согласовано ФЭУ	16.08.2021	Проверено ПТУ СК	16.08.2021
Тимошенко Маршала ул. 28	ХВС-Магистралы	Согласовано ФЭУ	16.08.2021	Проверено ПТУ СК	16.08.2021
Тимошенко Маршала ул. 28	ХВС-Стояки	Согласовано ФЭУ	03.09.2021	Проверено ПТУ СК	03.09.2021
Тимошенко Маршала ул. 28	Мусоропровод	Согласовано ФЭУ	02.09.2021	Проверено ПТУ СК	02.09.2021
Тимошенко Маршала ул. 28	Кровля	Согласовано ФЭУ	19.08.2021	Назначена комиссия ТУ	27.08.2021
Тимошенко Маршала ул. 28	Подвал	Согласовано ФЭУ	08.10.2021	Проверено ПТУ СК	08.10.2021
Тимошенко Маршала ул. 28	Подъезд				
Тимошенко Маршала ул. 28	Пож.водопровод	Согласовано ФЭУ	28.09.2021	Проверено ПТУ СК	28.09.2021
Тимошенко Маршала ул. 28	Фасад	Передано в ТУ от подрядчика	22.11.2021		

8 человек на объекте. МОП: отбивают краску с перилл в первом подъезде, готовят стены к окраске во втором.



ГБУ «Жилищник района Кунцево»

Партизанская ул, д. 33, к. 1

12 человек на объекте. МОП: остались доделки, установка перил.



ГБУ «Жилищник района Кунцево»

ул. Маршала Тимошенко, д. 26

7 человек на объекте. Шпатлевка, грунтовка стен.



ГБУ «Жилищник района Кунцево»

ул. Маршала Тимошенко, д. 28

4 человек на объекте. МОП: шпатлевка стен



О ходе производства работ ГБУ «ЖИЛИЩНИК МОЖАЙСКОГО РАЙОНА»

Адрес	Характеристики МКД	ХВС (стояки)	ХВС (магистрал и)	ГВС (стояки)	ГВС (магистрал и)	ВО (стояки)	ВО (магистрал и)	ЦО (стояки)	ЦО (магистрал и)	подвальн ые помещени я	крыша	фасад	внутренни й водосток	
Витебская ул. 10 к.1	2 Подъезда 9 Этажей 144 квартиры	Завершена (оплачена)		95				Завершена (оплачена)					Завершена (оплачена)	
				69/69										
				21.04.2021										
				20.08.2021										
Гжатская ул. 4 к.1	3 Подъезда 5 Этажей 60 квартир	Завершена (оплачена)					Завершена (оплачена)							
														95
														43/43
														21.04.2021
Неделина Маршала ул. 30 к.4	4 Подъезда 9 Этажей		Завершена (оплачена)		Завершена (оплачена)		Завершена (оплачена)		Завершена (оплачена)	95	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)		
										100				
										11.05.2021				
										20.09.2021				

Адрес	Вид работ(ФЭУ)	СТАТУС КС БАРС	Дата изменения статуса	Статус документов на оплату	Дата согласования ПТУ СК /изменения статуса
Витебская ул. 10 к.1	ГВС-Стояки	Проверено СК	12.11.2021	Проверено СК	19.10.2021
Гжатская ул. 4 к.1	ЦО-Стояки	Проверено СК	07.10.2021	Проверено СК	07.10.2021
Неделина Маршала ул. 30 к.4	Подвал	Проверено СК	22.09.2021	Проверено СК	15.11.2021

О ходе производства работ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ»

Адрес	Характеристики МКД	электроснабжение	ХВС (стояки)	ХВС (магистралы)	ГВС (стояки)	ГВС (магистралы)	ВО (магистралы)	ЦО (стояки)	ЦО (магистралы)	подвальные помещения	крыша	фасад	мусоропровод	МОП	
Колесовой Елены ул. 3	5 этажей 3 подъезда 65 квартир	95	Завершена (оплачена)	95	95	95	Завершена (оплачена)	95	95	Исключено	Исключено	95		95	
		100		100	12/12	100		12/12	100			100		80	
		11.04.2021		11.04.2021	11.04.2021	11.04.2021		11.04.2021	11.04.2021			11.04.2021		01.05.2021	
		10.08.2021		20.07.2021	19.09.2021	20.07.2021		19.09.2021	19.09.2021			29.09.2021		20.10.2021	
Матвеевская ул. 42 к.1	9 этажей 8 подъездов 287 квартир	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	95	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	95	Завершена (оплачена)	95	Завершена (оплачена)	95	
					98/98							90		100	90
					11.04.2021							11.05.2021		11.04.2021	01.05.2021
					19.09.2021							20.09.2021		29.09.2021	20.10.2021

Адрес	Вид работ(ФЭУ)	СТАТУС КС БАРС	Дата изменения статуса
Колесовой Елены ул. 3	Подъезд	Передано в ТУ от подрядчика	23.11.2021
Матвеевская ул. 42 к.1	Подъезд	Согласовано ИТН	23.11.2021

Району доложить о ходе сдачи второй КС на доп. Объемы по Колесовой Елены д.3



Системы со сдачей до 19.11.2021

ул. Елены Колесовой, д. 3

8 человек на объекте. МОП: идет ремонт стен и укладка плитки. 1 и 3 подъезды завершены.



ул. Матвеевская, д. 42, к.1

12 человек на объекте.

МОП: завершаются малярные работы, выполняется уборка проводки в короба;

Подвал: остался вывоз стройматериалов и уборка



О ходе производства работ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО»

Адрес	Характеристики МКД	электроснабжение	ХВС (стояки)	ХВС (магистралы)	ГВС (магистралы)	ВО (магистралы)	ЦО (стояки)	ЦО (магистралы)	подвалы и помещения	крыша	фасад	МОП	
Удальцова ул. 6	17 этажей 3 подъезда	Завершена (оплачена)		Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Исключение	Исключение	95		Исключение	30	
									100			55	
							11.04.2021	11.04.2021	11.05.2021			11.04.2021	01.05.2021
							19.09.2021	19.09.2021	20.09.2021			20.09.2021	20.10.2021
Цветной бульв. 25 с.1	7 этажей 4 подъезда 71 квартира	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)		Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	75	70	70	
										80	100	65	
										21.07.2020	21.07.2020	01.06.2021	
										20.08.2021	20.08.2021	30.09.2021	

Адрес	Вид работ(ФЭУ)	СТАТУС КС БАРС	Дата изменения статуса	Статус документов на оплату	Дата согласования ПТУ СК /изменения статуса
Цветной бульв. 25 с.1	Кровля	Согласовано ФЭУ	22.11.2021	Назначена комиссия ТУ	24.11.2021
Цветной бульв. 25 с.1	Подъезд	Согласовано СК	24.11.2021		
Цветной бульв. 25 с.1	Фасад	Согласовано СК	23.11.2021		
Удальцова ул. 6	Подвал	Согласовано ФЭУ	02.11.2021	Проверено ПТУ СК	02.11.2021
Удальцова ул. 6	Подъезд				



Системы со сдачей до 19.11.2021

ул. Удальцова, д. 6

5 человек на объекте.

МОП: идет ремонт стен в двух подъездах, установка дверей на этажах



ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского»

Цветной бульвар д. 25 стр. 1

МОП: 1 п. – окраска труб, остались перила и проводка; 2 п., - идет окраска перилл, осталась организация проводки;

3 п. - уборка, осталась организация проводки;

4 п. – ремонт стен; **черный ход** – выкрашен потолок, остались покраска стен и перилл

Крыша: идут монтажные работы, установлены ограждения

На момент обхода на объекте работает **23 человек**.



ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» Цветной бульвар д. 25 стр. 1

1 подъезд

2 подъезд




ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского»

Цветной бульвар д. 25 стр. 1

3 подъезд

Черный ход

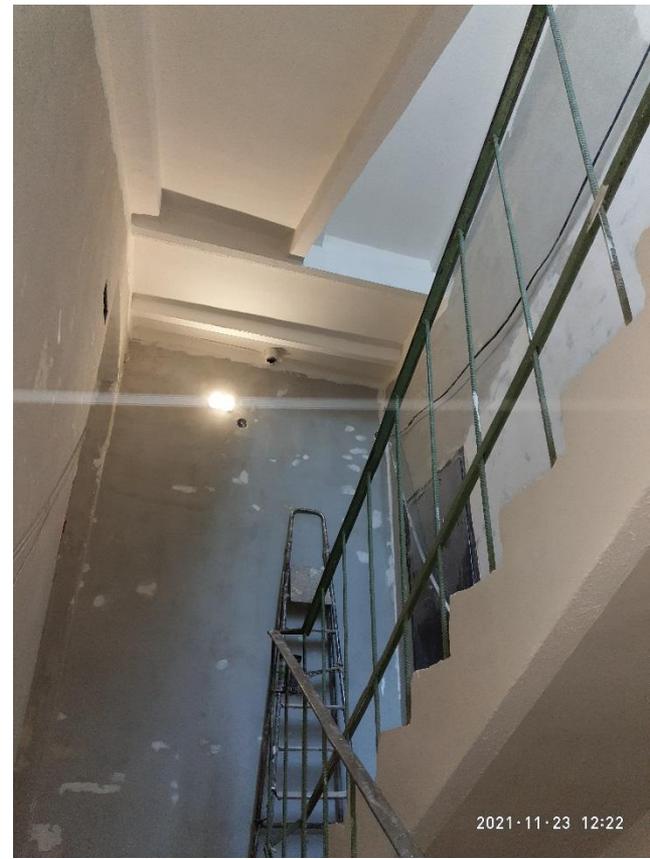

ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского»

Цветной бульвар д. 25 стр. 1

4 подъезд



О ходе производства работ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА РАМЕНКИ»

Адрес	Характеристик и МКД	электроснабжение	ХВС (стояки)	ХВС (магистраль)	ГВС (стояки)	ГВС (магистраль)	ВО (магистраль)	ЦО (стояки)	ЦО (магистраль)	подвальные помещения	крыша	фасад	МОП
Мосфильмовский 2-й пер. 12	14 этажей 1 подъезд 91 квартира	Завершена (оплачена)	95										
													100
													01.05.2021
													20.10.2021
Сетуньский 1-й пр. 12	14 этажей 1 подъезд 91 квартира	Завершена (оплачена)	95										
													100
													01.05.2021
													20.10.2021
Столетова ул. 4	9 этажей 1 подъезд 72 квартиры	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)		Завершена (оплачена)			Завершена (оплачена)			Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	95
													100
													01.05.2021
													20.10.2021
Столетова ул. 6	9 этажей 1 подъезд 72 квартиры	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)		Завершена (оплачена)			Завершена (оплачена)			Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	95
													100
													01.05.2021
													20.10.2021

Адрес	Вид работ(ФЭУ)	СТАТУС КС БАРС	Дата изменения статуса	Статус документов на оплату	Дата согласования ПТУ СК /изменения статуса
Мосфильмовский 2-й пер. 12	Подъезд	Согласовано ФЭУ	16.11.2021	Передано в одно окно	22.11.2021
Сетуньский 1-й пр. 12	Подъезд	Согласовано ФЭУ	17.11.2021	Передано в одно окно	22.11.2021
Столетова ул. 4	Подъезд	Согласовано ФЭУ	17.11.2021	Передано в одно окно	22.11.2021
Столетова ул. 6	Подъезд	Согласовано ФЭУ	17.11.2021	Передано в одно окно	22.11.2021

О ходе производства работ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОЛНЦЕВО»

Адрес	Характеристики МКД	электроснабжение	ХВС (стояки)	ХВС (магистрал и)	ГВС (стояки)	ГВС (магистрал и)	ВО (стояки)	ВО (магистрал и)	ЦО (стояки)	ЦО (магистрал и)	подвальные помещения	крыша	фасад	мусоропровод	МОП	внутренний водосток
Солнцевский просп. 7 к.1	2 подъезда 16 этажей 128 квартир	Завершена (оплачена)	95	Завершена (оплачена)												
															100	
															01.05.2021	
															20.10.2021	

Адрес	Вид работ(ФЭУ)	СТАТУС КС БАРС	Дата изменения статуса	Статус документов на оплату	Дата согласования ПТУ СК /изменения статуса
Солнцевский просп. 7 к.1	Подъезд	Согласовано ФЭУ	19.11.2021	Проверено ПТУ СК	22.11.2021

Солнцевский просп., д. 7, к. 1

2 человека на объекте. Фасад: завершается монтаж балконных экранов;



О ходе производства работ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО»

Адрес	Характеристики МКД	ХВС (стояки)	ХВС (магистрал и)	ГВС (стояки)	ГВС (магистрал и)	ВО (магистрал и)	ЦО (магистрал и)	подвальн ые помещени я	крыша	фасад	мусоропр овод	МОП	внутренни й водосток
Анохина Академика ул. 34 к.1	17 этажей 6 подъездов 407 квартир	Исключение	Завершена (оплачена)	Исключение	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	95	Завершена (оплачена)	60	Завершена (оплачена)
		21.05.2021		21.05.2021						100		75	
		20.09.2021		20.09.2021						21.05.2021		11.06.2021	
				20.09.2021						30.09.2021		31.10.2021	
Анохина Академика ул. 34 к.2	17 этажей 6 подъездов 407 квартир	Исключение	Завершена (оплачена)	Исключение	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	95	Завершена (оплачена)	70	Завершена (оплачена)
		21.05.2021		21.05.2021						100		75	
		20.09.2021		20.09.2021						21.05.2021		11.06.2021	
				20.09.2021						30.09.2021		31.10.2021	

Адрес	Вид работ(ФЭУ)	СТАТУС КС БАРС	Дата изменения статуса
Анохина Академика ул. 34 к.1	Подъезд	Возвращено подрядчику	22.11.2021
Анохина Академика ул. 34 к.1	Фасад	Передано в ТУ от подрядчика	24.11.2021
Анохина Академика ул. 34 к.2	Подъезд	Возвращено подрядчику	22.11.2021
Анохина Академика ул. 34 к.2	Фасад	Передано в ТУ от подрядчика	23.11.2021




Системы со сдачей до 19.11.2021

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино»

Академика Анохина, д. 34, к. 1

35 человек на объекте.

МОП: малярные работы, укладка плитки;

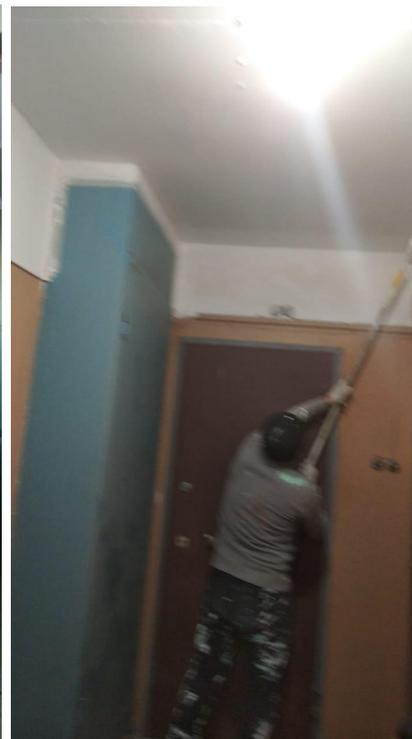


ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино»

Академика Анохина, д. 34, к. 2

32 человека на объекте.

МОП: малярные работы, укладка плитки

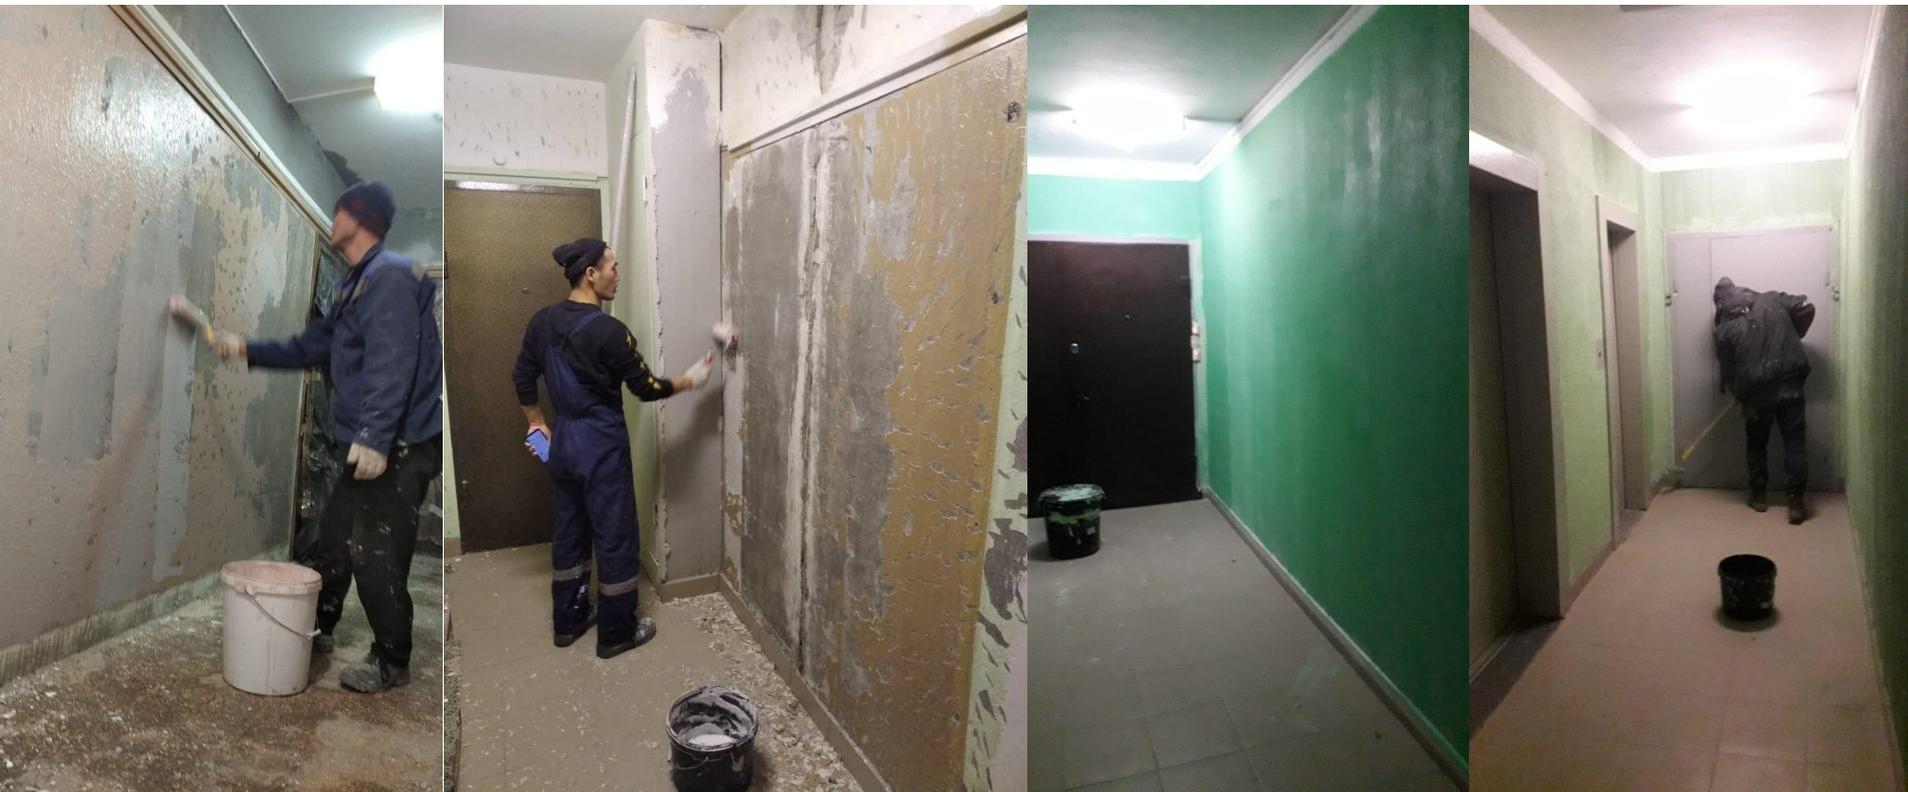

О ходе производства работ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ФИЛЕВСКИЙ ПАРК»

Адрес	Характеристик и МКД	электроснабжение	ХВС (магистралаи)	ГВС (магистралаи)	ВО (магистралаи)	ЦО (магистралаи)	подвальны е помещения	крыша	фасад	мусоропровод	МОП	внутренний водосток	пожарный водопровод
Филевский бульв. 13 к.1	17 этажей 1 подъезд	Завершен а (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершен а (оплачена)	Завершен а (оплачена)	Завершен а (оплачена)	Завершен а (оплачена)	95	Завершен а (оплачена)	Завершен а (оплачена)
											90		
											01.05.2021		
											20.10.2021		

Адрес	Вид работ(ФЭУ)	СТАТУС КС БАРС	Дата изменения статуса	Статус документов на оплату	Дата согласования ПТУ СК /изменения статуса
Филевский бульв. 13 к.1	Подъезд	Согласовано ФЭУ	22.11.2021	Проверено ПТУ СК	23.11.2021

ГБУ «Жилищник района Филевский парк» Филевский бульвар, д. 13 корп.1

Фасад: остается замена входной двери

МОП: осталось установка дверей

На момент обхода на объекте работает **6 человек**.



О ходе производства работ ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ФИЛИ ДАВЫДКОВО»

Адрес	Характеристика и МКД	электроснабжение	ХВС (стояки)	ХВС (магистрала)	ГВС (стояки)	ГВС (магистрала)	ВО (магистрала)	ЦО (стояки)	ЦО (магистрала)	подвальные помещения	крыша	фасад	мусоропровод	МОП
Минская ул. 15 к.1	5 этажей 3 подъезда 60 квартир		Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)		Завершена (оплачена)		45				
														50
														11.05.2021
														01.04.2022
Филевская Б. ул. 41 к.1	5 этажей 4 подъезда	Завершена (оплачена)		Завершена (оплачена)		Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)		Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)	Завершена (оплачена)		95
														95
														Завершена (оплачена)

Адрес	Вид работ(ФЭУ)	СТАТУС КС БАРС	Дата изменения статуса
Минская ул. 15 к.1	Подъезд	Согласовано ИТН	24.11.2021


ГБУ «Жилищник района Крылатское»

Минская ул., д. 15, к.1

МОП: 1й подъезд – малярные работы;

3й подъезд - укладка напольной плитки

На момент обхода на объекте работает **6 человек.**

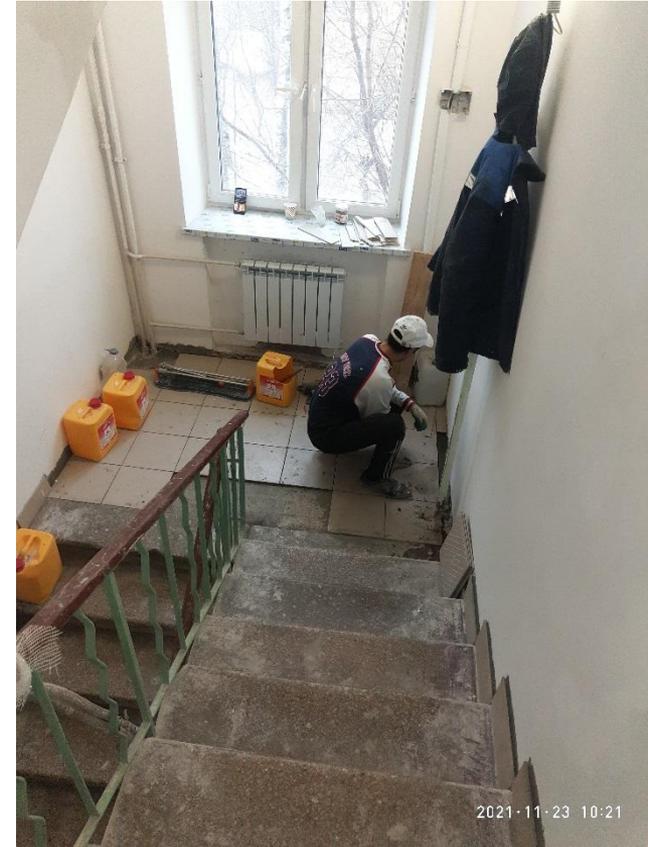

ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» Большая Филевская ул., д. 41 корп.1

МОП: затирка плитки, работы близки к завершению.
На момент обхода на объекте работает 8 человек.

