



Вопрос 1.

О реализации программы «Решаем вместе». О завершении работ по ремонту дворов в рамках программы «Обустроим область к юбилею»




В рамках реализации программы «Обустроим область к Юбилею» в 2016 году было не завершено благоустройство на 18 дворовых территориях.

№ п/п	Адрес дворовых территорий	Подрядная организация	Стоимость работ по контракту (руб.)	Закрыто актами в 2016 г. от общей стоимости на сумму (руб.).		Банковская гарантия	неустойка
					%		
1	Наб. Космонавтов, д. 57;	ООО "ДСУ-1" Контракт №154 от 19.07.2016	3 082 296,88	439 797,88	14,3%	622 843,77	137 025,63
2	ул. Качалова, д. 18,20;		837 569,90	177 442,97	21,2%		
3	ул. Качалова, д. 38,40, Звездная ул., д. 10 (4 подъезд);		3 109 742,50	2 878 770,95	92,6%		
4	Звездная ул., д. 10 (1,2,3 подъезды);		3 202 053,90	1 368 007,95	42,7%		
5	Спортивная ул., д. 3;		2 225 212,14	738 515,04	33,2%		
	ИТОГО:		12 456 875,32	5 602 534,79			
6	ул. Кольшикина, д. 15;	ООО "ДСУ-1" Контракт №155 от 19.07.2016	4 893 334,92	1 412 903,60	28,9%	671 579,00	147 747,38
7	ул. Куйбышева, д. 66,66а;		3 863 073,38	2 363 965,64	61,2%		
	ИТОГО:		8 756 408,30	3 776 869,24			
8	Крестовая ул., д. 141;	ООО "ДСУ-1" Контракт №156 от 19.07.2016	2 689 479,60	313 748,83	11,7%	919 840,98	202 365,01
9	пр. Ленина, д. 159,161.		3 643 560,34	3 137 088,66	86,1%		
10	Новая ул., д. 1;		894 583,96	226 096,59	25,3%		
	ИТОГО:		7 227 623,90	3 676 934,08			
11	1-ая Выборгская ул., д. 54,56, Волочаевская ул., д. 40,42;	ООО "ДСУ-1" Контракт №157 от 19.07.2016	7 673 471,56	5 467 423,74	71,3%	719 555,80	158 302,28
12	ул. Боткина, д. 18;		2 002 480,06	588 885,95	29,4%		
13	ул. Гагарина, д. 16;		2 062 813,46	617 351,22	29,9%		
14	ул. Щепкина, д. 12;		2 652 350,90	589 083,19	22,2%		
	ИТОГО:		14 391 115,98	7 262 744,10			
	ВСЕГО по ООО "ДСУ-1"		42 832 023,50	20 319 082,21		2 933 819,55	645 440,30
15	ул. Расторгуева, д. 14;	ООО "СМО-1" Контракт №149 от 12.07.2016	796 584,96	282 858,19	35,5%	120 355,69	54 882,20
16	ул. Ворошилова, д. 4;		1 610 528,90	166 016,56	10,3%		
	ИТОГО:		2 407 113,86	448 874,75			
17	ул. Ворошилова, д. 19;	ООО "СМО-1" Контракт №150 от 12.07.2016	2 622 770,66	1 107 480,40	42,2%	131 138,53	59 799,17
	ИТОГО:		2 622 770,66	1 107 480,40			
18	пр. Серова, д. 2,4;	ООО "СМО-1" Контракт №151 от 12.07.2016	2 464 768,66	1 074 726,29	43,6%	123 238,43	56 196,73
	ИТОГО:		2 464 768,66	1 074 726,29			
	ВСЕГО по ООО "СМО-1"		7 494 653,18	2 631 081,44		374 732,65	170 878,10
	ВСЕГО:		50 326 676,68	22 950 163,65		3 308 552,20	816 318,40



График окончания работ ООО «СМО-1»

СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО «СМО-1»

С.А. Кононин


УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы Администрации
по городскому хозяйству

А.В. Рябченков

График выполнения работ по окончанию ремонта дворовых территорий 2016г.

№ п/п	Адрес дворовых территорий	Подрядная организация	Стоимость работ по контракту (руб.)	Закрыто актами в 2016 г. от общей стоимости на сумму (руб.)		Срок выполнения работ
					%	
1	ул. Расторгуева, д. 14;	ООО "СМО-1" Контрак №149 от 12.07.2016	796 584,96	282 858,19	35,5%	1.05-15.05
2	ул. Ворошилова, д. 4;		1 610 528,90	166 016,56	10,3%	16.05-31.05
	ИТОГО:		2 407 113,86	448 874,75		
3	ул. Ворошилова, д. 19;	ООО "СМО-1" Контрак №150 от 12.07.2016	2 622 770,66	1 107 480,40	42,2%	12.05-25.05
	ИТОГО:			2 622 770,66	1 107 480,40	
4	пр. Серова, д. 2,4;	ООО "СМО-1" Контрак №151 от 12.07.2016	2 464 768,66	1 074 726,29	43,6%	1.05-31.05
	ИТОГО:			2 464 768,66	1 074 726,29	
	ВСЕГО по ООО "СМО-1"		7 494 653,18	2 631 081,44		

Директор МБУ «Управление городского хозяйства»


 А.Б. Зубов



График окончания работ ООО «ДСУ-1»



СОГЛАСОВАНО:
Директор ООО «ДСУ-1»

Д.В. Дуденков

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы Администрации
по городскому хозяйству

А.В. Рябченков

График выполнения работ по окончанию ремонта дворовых территорий 2016г.

№ п/п	Адрес дворовых территорий	Подрядная организация	Стоимость работ по контракту (руб.)	Закрты актами в 2016 г. от общей стоимости на сумму		Перечень оставшихся работ	Срок выполнения работ
				(руб.)	%		
1	Наб. Космонавтов, д. 57;	ООО "ДСУ-1" Контракт №154 от 19.07.2016	3 082 296,88	439 797,88	14,3%	Устройство песчаного и щебеночного слоев основания на тротуарах, устройство нижнего и верхнего слоев АБ покрытия на проездах, устройство АБ покрытия на тротуарах, подсыпка и планировка грунта, вывоз мусора.	1.05-21.05
2	ул. Качалова, д. 18,20;		837 569,90	177 442,97	21,2%	Устройство песчаного и щебеночного слоев основания на тротуарах, устройство нижнего и верхнего слоев АБ покрытия на проездах, устройство АБ покрытия на тротуарах, подсыпка и планировка грунта, вывоз мусора.	22.05-31.05
3	ул. Качалова, д. 38,40, Звездная ул., д. 10 (4 подъезд);		3 109 742,50	2 878 770,95	92,6%	Устройство верхнего слоя АБ покрытия на проездах, подсыпка и планировка грунта, вывоз мусора.	1.05-12.05
4	Звездная ул., д. 10 (1,2,3 подъезды);		3 202 053,90	1 368 007,95	42,7%	Устройство верхнего слоя АБ покрытия на проездах, подсыпка и планировка грунта, вывоз мусора.	1.05-18.05
5	Спортивная ул., д. 3;		2 225 212,14	738 515,04	33,2%	Устройство верхнего и нижнего слоев АБ покрытия на проездах, устройство АБ покрытия на тротуарах, подсыпка и планировка грунта, вывоз мусора.	15.05-31.05
ИТОГО:			12 456 875,32	5 602 534,79			
6	ул. Коляшкина, д. 15;	ООО "ДСУ-1" Контракт №155 от 19.07.2016	4 893 334,92	1 412 903,60	28,9%	Устройство песчаного и щебеночного слоев основания на улицах, устройство нижнего и верхнего слоев АБ покрытия на проездах, устройство АБ покрытия на тротуарах, подсыпка и планировка грунта, вывоз мусора.	1.05-21.05
7	ул. Куйбышева, д. 66,66а;		3 863 073,38	2 363 965,64	61,2%	Устройство верхнего и нижнего слоев АБ покрытия на проездах, устройство АБ покрытия на тротуарах, подсыпка и планировка грунта, вывоз мусора.	22.05-31.05
ИТОГО:			8 756 408,30	3 776 869,24			



График окончания работ ООО «ДСУ-1»

8	Крестовая ул., д. 141;	ООО "ДСУ-1" Контракт №156 от 19.07.2016	2 689 479,60	313 748,83	11,7%	Устройство песчаного и щебеночного слоев основания на тротуарах, устройство покрытия на проездах, устройство АБ покрытия на тротуарах, подсыпка и планировка грунта, вывоз мусора.	1.06-15.06
9	пр. Ленина, д. 159,161.		3 643 560,34	3 137 088,66	86,1%	Устройство АБ покрытия на тротуарах, подсыпка и планировка грунта, вывоз мусора.	15.06-30.06
10	Новая ул., д. 1;		894 583,96	226 096,59	25,3%	Устройство щебеночного слоя основания, устройство покрытия на проездах, подсыпка и планировка грунта, вывоз мусора.	10.06-24.06
ИТОГО:			7 227 623,90	3 676 934,08			
11	1-ая Выборгская ул., д. 54,56, Волочаевская ул., д. 40,42;	ООО "ДСУ-1" Контракт №157 от 19.07.2016	7 673 471,56	5 467 423,74	71,3%	Устройство АБ покрытия на тротуарах, подсыпка и планировка грунта, вывоз мусора.	1.06-15.06
12	ул. Боткина, д. 18;		2 002 480,06	588 885,95	29,4%	Устройство песчаного и щебеночного слоев основания на узких участках, устройство покрытия на проездах, устройство АБ покрытия на тротуарах, подсыпка и планировка грунта, вывоз мусора.	1.06-20.06
13	ул. Гагарина, д. 16;		2 062 813,46	617 351,22	29,9%	Устройство нижнего и верхнего слоев АБ покрытия на проездах, устройство АБ покрытия на тротуарах, подсыпка и планировка грунта, вывоз мусора.	20.06-30.06
14	ул. Щепкина, д. 12;		2 652 350,90	589 083,19	22,2%	Устройство нижнего и верхнего слоев АБ покрытия на проездах, устройство АБ покрытия на тротуарах, подсыпка и планировка грунта, вывоз мусора.	10.06-24.06
ИТОГО:			14 391 115,98	7 262 744,10			
ВСЕГО по ООО "ДСУ-1"			42 832 023,50	20 319 082,21			

Директор МБУ «Управление городского хозяйства»

 А.Б. Зубов



Состояние дел по ремонту дворов на 17.04.2017

На 17.04.2017:

ООО «СМО-1» приступила к ремонту дворовой территории ул.Ворошилова, д.19

ООО «ДСУ-1» приступила к ремонту дворовой территории ул. Гагарина, д. 16



Ремонт дворовой территории по адресу: Набережная Космонавтов д.№57 подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам	Необходимые для завершения работы
Отклонение бортовых камней от оси по вертикали и горизонтали.	Устройство песчаного и щебеночного основания на тротуарах, с последующим устройством а/б покрытия; устройство песчаного и щебеночного основания на уширении проезжей части и парковке, с последующим устройством нижнего и верхнего слоев а/б покрытия; подсыпка и планировка грунта. Демонтаж/ установка существующих бортовых камней на 20% камней.



Ремонт дворовой территории по адресу: Звездная ул. д. №10 (1, 2, 3 подъезды) подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам

Отклонение бортовых камней от оси по вертикали и горизонтали, наличие строительного мусора, отсутствие верхнего слоя в а/б покрытия в проезде, многочисленные провалы в а/б покрытии проезда, наличие продольных и поперечных трещин в а/б покрытии.

Необходимые для завершения работы

Вывоз строительного мусора, демонтаж 30% нижнего слоя а/б покрытия, с последующим устройством нижнего и верхнего слоев а/б покрытия; подсыпка и планировка грунта. Демонтаж/ установка существующих бортовых камней на 10% камней.



Ремонт дворовой территории по адресу: ул. Качалова д. 38, 40 (4 подъезд) подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам

Износ а/б покрытия и выкрашивание щебня из а/б покрытия на тротуаре; в виду некачественного производства работ по очистке проезда от льда и снега, не возможно определить наличие недостатков в а/б покрытии на проездах.

Необходимые для завершения работы

Фрезерование изношенного а/б покрытия на тротуаре с последующей укладкой верхнего слоя а/б покрытия на тротуаре. Устройство верхнего слоя а/б покрытия в районе выезда на Звездную ул.



Ремонт дворовой территории по адресу: ул. Качалова д.№18, 20 подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам

Отклонение бортовых камней от оси по вертикали и горизонтали.

Необходимые для завершения работы

Устройство щебеночного основания на тротуарах, с последующим устройством а/б покрытия; устройство нижнего и верхнего слоев а/б покрытия подсыпка и планировка грунта. Демонтаж/ установка существующих бортовых камней на 10% камней.



Ремонт дворовой территории по Спортивной ул., д. 3; подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам

Отклонение бортовых камней от оси по вертикали и горизонтали, провалы в щебеночном покрытии на тротуаре и парковке, наличие строительного мусора.

Необходимые для завершения работы

Подсыпка и уплотнение щебеночного основания на тротуаре и парковке, устройство а/б покрытия на тротуаре. Устройство нижнего и верхнего а/б покрытия на проезде и парковке. Вывоз строительного мусора. Добавление и планировка растительного грунта.



Ремонт дворовой территории по адресу: ул. Кольшкина, д. 15; подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам

Отклонение бортовых камней от оси по вертикали и горизонтали, разрушение а/б покрытия на тротуаре. Наличие строительного мусора.

Необходимые для завершения работы

Демонтаж и установка бортовых камней; В месте разрушения а/б покрытия на тротуаре требуется разобрать покрытие и выполнить устройство нового а/б покрытия тротуара; Отсыпка щебеночного основания на тротуаре, разработка грунта на месте уширения проезжей части, отсыпка песчаного и щебеночного основания на уширениях, устройство а/б покрытия. Вывоз строительного мусора. Добавление и планировка растительного грунта.



Ремонт дворовой территории по адресу: ул. Куйбышева, д. 66,66а; подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам

Наличие строительного мусора, провалы в а/б покрытия проездов.

Необходимые для завершения работы

Отсыпка песчаного и щебеночного слоя основания на тротуарах с последующим устройством а/б покрытия. В местах провала а/б покрытия выполнить работы по фрезерованию а/б покрытия с последующим устройством верхнего слоя а/б покрытия. Укладка верхнего слоя а/б покрытия на проезде и парковке. Вывоз строительного мусора. Добавление и планировка растительного грунта.



Ремонт дворовой территории по Крестовая ул., д. 141; подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам

Наличие строительного мусора, провалы в щебеночном покрытии на тротуарах и парковке. Отклонение бортовых камней от оси по вертикали и горизонтали.

Необходимые для завершения работы

Подсыпка и уплотнение щебеночного основания на тротуаре и парковке, устройство а/б покрытия на тротуаре. Устройство нижнего и верхнего а/б покрытия на проезде и парковке. Вывоз строительного мусора. Добавление и планировка растительного грунта. Демонтаж/ установка существующих бортовых камней на 20% камней.



Ремонт дворовой территории по пр. Ленина, д. 159,161. подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам

Наличие строительного мусора, провалы в а/б покрытия на тротуаре. Поднятие горловины колодцев с нарушением СНиП.

Необходимые для завершения работы

Вывоз строительного мусора, установка бортовых камней, устройство песчаного и щебеночного основания на тротуаре с последующей укладкой слоя а/б покрытия. В местах провала а/б покрытия выполнить работы по фрезерованию а/б покрытия с последующим устройством верхнего слоя а/б покрытия. Выполнить работы по поднятию горловин колодцев. Добавление и планировка растительного грунта.



Ремонт дворовой территории по 1-ая Выборгская ул., д. 54,56, Волочаевская ул., д. 40,42; подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам

Износ а/б покрытия и выкрашивание щебня из а/б покрытия на тротуаре, повреждение металлических конструкций площадки ТБО, провалы в асфальтобетонном покрытии.

Необходимые для завершения работы

В местах провалов и износа а/б покрытия выполнить фрезеровку с последующим устройством нового слоя а/б покрытия; Восстановить конструкции площадки ТБО.
досыпка щебеночного слоя основания на тротуарах, устройство АБ покрытия, подсыпка и планировка грунта, вывоз строительного мусора.



Ремонт дворовой территории по ул. Боткина д.18 подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам

Отклонение бортовых камней от оси по вертикали и горизонтали.

Необходимые для завершения работы

Демонтаж и установка бортовых камней, досыпка щебеночного слоя основания на тротуарах, досыпка щебеночного слоя основания на уширениях, устройство АБ покрытия, подсыпка и планировка грунта, вывоз строительного мусора.



Ремонт дворовой территории по ул. Гагарина д.16 подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам

Отклонение бортовых камней от оси по вертикали и горизонтали.

Необходимые для завершения работы

Демонтаж и установка бортовых камней, досыпка щебеночного слоя основания на тротуарах, досыпка щебеночного слоя основания на уширениях, устройство АБ покрытия, подсыпка и планировка грунта, вывоз строительного мусора.



Ремонт дворовой территории по ул. Щепкина д.12 подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам	Необходимые для завершения работы
Отклонение бортовых камней от оси по вертикали и горизонтали.	Демонтаж и установка бортовых камней, отсыпка песчаного и щебеночного слоев основания на тротуарах, досыпка щебеночного слоя основания на уширениях, устройство АБ покрытия, подсыпка и планировка грунта, вывоз строительного мусора.



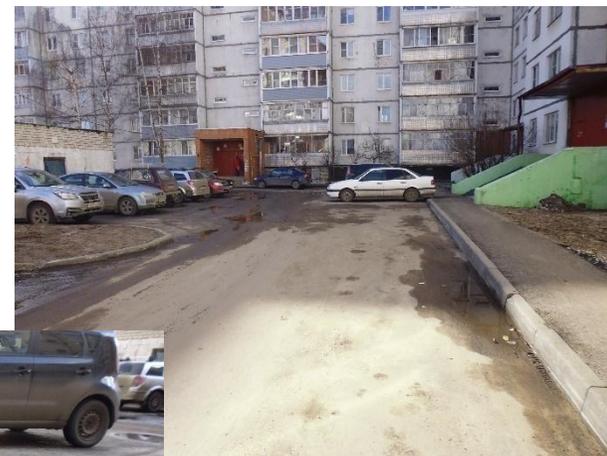
Ремонт дворовой территории по ул. Куйбышева д. 5,7 подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам	Необходимые для завершения работы
Наличие строительного мусора	Вывоз строительного мусора, подсыпка и планировка грунта.



Ремонт дворовой территории по ул. Моторостроителей д.21 подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам

Износ а/б покрытия и выкрашивание щебня из а/б покрытия на тротуаре; Строительный мусор.

Необходимые для завершения работы

Фрезерование изношенного а/б покрытия на тротуаре с последующей укладкой слоя а/б покрытия на тротуаре.
Вывоз строительного мусора, подсыпка и планировка грунта.



Ремонт дворовой территории по ул. Луначарского д.27 подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам	Необходимые для завершения работы
Износ а/б покрытия и выкрашивание щебня из а/б покрытия на тротуаре и проезде; Строительный мусор.	Фрезерование изношенного а/б покрытия с последующей укладкой слоя а/б покрытия на тротуаре и проезде. Вывоз строительного мусора, подсыпка и планировка грунта. Укрепление бортовых камней на парковке асфальтобетоном.



Ремонт дворовой территории по ул. Димитрова д.3 подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам	Необходимые для завершения работы
<p>Поднятие горловин колодцев с нарушением СНиП, строительный мусор, Износ а/б покрытия и выкрашивание щебня из а/б покрытия на проезде;</p>	<p>Фрезерование изношенного а/б покрытия на с последующей укладкой слоя а/б покрытия на проезде. Поднятие горловин колодцев, вывоз строительного мусора, подсыпка и планировка грунта.</p>



Ремонт дворовой территории по Новой ул. д.1 подрядная организация ООО «ДСУ-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам

Отклонение бортовых камней от оси по вертикали и горизонтали, строительный мусор.

Необходимые для завершения работы

Демонтаж и установка бортовых камней, досыпка щебеночного слоя основания на проезде, устройство АБ покрытия, подсыпка и планировка грунта, вывоз строительного мусора.



Ремонт дворовой территории по ул. Расторгуева д.14 подрядная организация ООО «СМО-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам	Необходимые для завершения работы
Отклонение бортовых камней от оси по вертикали и горизонтали.	Демонтаж и установка бортовых камней, отсыпка щебеночного слоя основания на тротуарах, досыпка щебеночного слоя основания на проездах, устройство АБ покрытия, подсыпка и планировка грунта, вывоз строительного мусора.



Ремонт дворовой территории по ул. Ворошилова д.19 подрядная организация ООО «СМО-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам

Отклонение бортовых камней от оси по вертикали и горизонтали.

Необходимые для завершения работы

Демонтаж и установка бортовых камней, досыпка щебеночного слоя основания на тротуарах, досыпка щебеночного слоя основания на уширениях, устройство АБ покрытия, подсыпка и планировка грунта, вывоз строительного мусора.



Ремонт дворовой территории по пр. Серова д. 2,4 подрядная организация ООО «СМО-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам

Отклонение бортовых камней от оси по вертикали и горизонтали.

Необходимые для завершения работы

Демонтаж и установка бортовых камней, отсыпка песчаного и щебеночного слоев основания тротуаров, досыпка щебеночного слоя основания на уширениях, устройство АБ покрытия, подсыпка и планировка грунта, вывоз строительного мусора.



Ремонт дворовой территории по ул. Ворошилова д.4 подрядная организация ООО «СМО-1»



Выявленные недостатки по выполненным работам	Необходимые для завершения работы
	Установка бортовых камней, отсыпка щебеночного слоя основания на проезде, устройство АБ покрытия, подсыпка и планировка грунта, вывоз строительного мусора.
