

О ходе реализации Программы «Развитие регионов до 2025 г.»




ПРОЕКТЫ НА 2020 ГОД

E AN						
Nº	Всего 4 проекта на сумму 4,1млрд. тенге (РБ – 3,3 млрд. тг, ОБ – 858,5 млн.тг)	Средства, 4,1 млрд. тенге				
1	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей, 2 очередь	1 382,9				
2	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей, 3 очередь	1 216,5				
3	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей 1 очередь	820				
4	Реконструкция хозпитьевых очистных сооружении 3 очередь	705				



Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Жезказган, 1,2,3 очереди

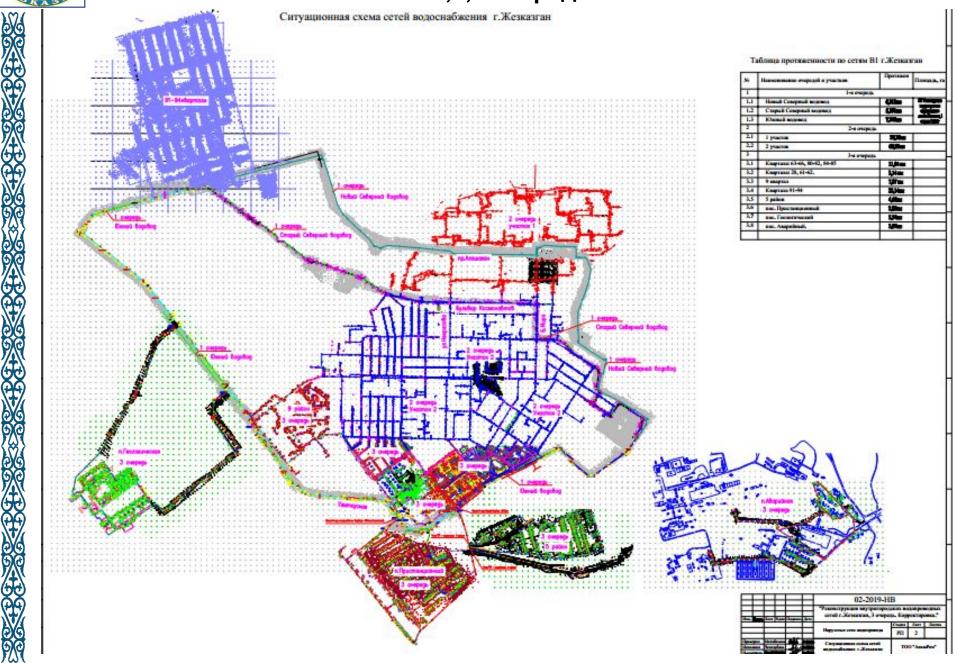



РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ (2 очередь)

Период реализации – 2017-2021 гг. Общая стоимость – 3,2 млрд.тенге Общая протяженность – 85,9 км Участки реконструкции:

Участок 1 - микрорайоны: 2-6.

Участок 2 - микрорайон 1; квартала: 1-10, 5a-6a, 15-16, 19-27, 29-33, 67-69, 69a, 72-79, 76a, 79a, 83, 83a, 83б

2017 год:

- **-** освоено 215,1 млн. тенге;
- реконструировано 6,1 км или 7,1%.

2018 год:

- **-** освоено 297,8 млн. тенге;
- реконструировано 9,0 км или 10,4%.

2019 год:

- освоено 329,2 млн. тенге;
- реконструировано 4,5 км или 5,2%.

2020 год:

- выделено 1,4 млрд. тенге;
- освоено 624 млн. тенге;
- план реконструкции 42,5 км;
- реконструировано 12,5 км или 29,4%.

- необходимые средства
 на завершение 937,8 млн.тенге
- план реконструкции 23,8 км.





Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.





Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.

Жезказган, 2 очередь, Ул. Ранова







Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Жезказган, 2 очередь, Ул. Штифанова





Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Жезказган, 2 очередь, ул. Гагарина







РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ (3 очередь)

Период реализации – 2017-2021 гг. Общая стоимость – 2,5 млрд.тенге Общая протяженность – 117,7 км Участки реконструкции:

Квартала: 63-66, 80-80, 84-85, 28, 61-62, 9;

91-94 квартала, 5 район, поселки:

Пристанционный, Геологический, Аварийный.

2017 год:

- освоено 174,3 млн. тенге;
- реконструировано 13 км или 10,9%.

2018 год:

- освоено 312,2 млн. тенге;
- реконструировано 26,4 км или 22,3%.

2019 год:

- освоено 351,0 млн. тенге;
- реконструировано 18,3 км или 15,4%.

2020 год:

- выделено 1,2 млрд. тенге;
- план реконструкции 47,7 км.
- освоено 639,6 млн. тенге;
- реконструировано 16 км или 33,5%.

- необходимые средства
 на завершение 452,9 млн.тенге
- план реконструкции 12,8 км





Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Жезказган, 3 очередь, Ул. Тусупбекова





РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ (1 очередь)

Период реализации – 2019-2021 гг. Общая стоимость – 3,7 млрд.тенге Общая протяженность – 21,2 км

Участки реконструкции: Новый Северный водовод, Старый Северный водовод, Южный водовод.

2019 год:

- освоено 317,3 млн. тенге;
- реконструировано 3,1 км или 15,3%.

2020 год:

- выделено 820 млн. тенге;
- план реконструкции 6,4 км;
- освоено 86 млн.тенге;
- реконструировано 1,2 км или 20%.

- необходимые средствана завершение 2,6 млрд.тенге
- план реконструкции 10,7 км.





Реконструкция хозяйственно – питьевых очистных сооружений (3 очередь)

Период реализации – 2019 - 2021 гг. Общая стоимость – 4,4 млрд.тенге Участки реконструкции:

реконструкция насосной станции 2 подъема; строительство водовода от Уйтас-Айдосского водозабора и водовода Кенгирского водохранилища; прокладка внутриплощадочных сетей; реконструкция резервуара чистой воды (РЧВ) объемом 10 000 куб.м. - 1шт;

прокладка внутриплощадочных сетей протяженностью - 4,0 км; строительство фундамента под блочно-модульное здание ВЧРП (высоковольтного частотно-регулируемого привода); строительство РЧВ объемами: 1700куб.м. - 1шт, 2000куб.м.

- Зшт, 4600куб.м. - 2шт; строительство ТП модульного типа 0,4кВ; строительство КРУ 35кВ.

2019 год:

- освоено 500,0 млн. тенге;
- реконструировано 790 м.

2020 год:

- выделено 705,4 млн. тенге;
- план реконструкции 1,5 км.

- необходимые средства
 на завершение 3,2 млрд..тенге
- план реконструкции 12,8 км







РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЙ

1	VΩ	Наименование	Сумма млн.тенге	Примечание
		Корректировка ПСД на реконструкцию хозяйственно- питьевых очистных сооружений города Жезказган, 2 очередь	107	Договор заключен с ТОО "АкваРем". Срок завершения работ – сентябрь т.г. Планируемый срок получения экспертизы – ноябрь 2020 г.

