



**Итоги работы путевой машинной станции № 55
Московской дирекции по ремонту пути за 7 месяцев 2020 г**

**Докладчик:
Начальник ПМС-55**

Трифонов С.В.

Выполнение ключевых показателей деятельности за 7 месяцев 2020 г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Ответственные исполнители (цеха)	факт за аналогичный период 2019 г	5 месяцев 2020 г.			
					план	факт	%	выполнено/не выполнено
1	Поступление выручки по прочим видам деятельности	млн.руб.	Зам.начальника	25,8	25,6	29,2	114	выполнено
2	Расходы по перевозочным видам деятельности	млн.руб.	нач.сектора	14,6	7,4	8,8	118,7	Не выполнено
3	Финансовый результат по прочим видам деятельности	млн.руб.	нач.сектора	6,6	4,8	7,0	145	выполнено
4	Себестоимость на единицу продукции	тыс.руб./прив.км	Нач.ПТО	904	765	784	102	Не выполнено
5	Удельные затраты на модернизацию и реконструкцию	млн.руб./прив.км	Нач.ПТО	0	0,803	0,829	103	Не выполнено
6	Доля пути, сданного в эксплуатацию с оценкой "отлично" по всем видам ремонта	%	Нач.ПТО	0	0	0	0	выполнено
7	Объем работ по всем видам ремонта пути	прив.км	Нач.ПТО	341,2	284,5	346,1	119	выполнено
8	Удельная выработка путевых машин	прив.км/ед.	Гл.механик	17,6	14,7	17,5	119	выполнено
9	Темп роста производительности труда (по перевозочным видам деятельности)	%	Вед.инженер ОиНТ	98	103	105,4	102,3	выполнено
10	Текучность кадров	%	Вед.спецОК	3,4	0	7,55	0	Не выполнено
11	Укомплектованность штата	%	Вед.спецОК	96,9	343	315	94,3	Не выполнено
12	Соотношение уровня оплаты труда работников с общероссийским	раз	Вед.инженер ОиНТ	0,98	1	1	100	выполнено
13	Количество пострадавших со смертельным исходом	чел.	Гл.инженер	0	0	0	0	выполнено
14	Действующие предупреждения об ограничении скорости движения поездов на главных путях	ед.	Нач.ПТО	3	1	1	100	выполнено
15	Количество крушений поездов	ед.	Нач.ПТО	0	0	0	100	выполнено
16	Количество аварий	ед.	Нач.ПТО	0	0	0	100	выполнено
17	Количество сходов железнодорожного подвижного состава	ед.	Нач.ПТО	0	0	0	100	выполнено
18	Количество столкновений подвижного состава	ед.	Нач.ПТО	0	0	0	100	выполнено
19	Уровень безопасности движения	ед./млн.поездо-км	Нач.ПТО	0	0	0	100	выполнено
20	Интенсивность отказов	ед./100 км		0,02	0,02	0,03	150	Не выполнено
21	Удельное время задержки поездов по причине отказов в работе технических средств 1, 2 категорий	поездо-час/100км	Нач.ПТО	0,0093	0,091	0,022	100	выполнено
22	Удельное время задержки поездов по причине технологических нарушений	поездо-час/100км	Нач.ПТО	0,005	0	0,0442	0	Не выполнено

Исполнение поручений протокола №МОСКДРП-114/пр от «23»июля2020 г.

№	Поручение по допущенному замечанию в ходе проверки	Пояснение о причинах допущенного замечания (принятые решения) Пояснение по исполнению поручения	Выполнено «+» / не выполнено «-»
1	Направить запрос о предоставление информации по местонахождению платформы №42298836, числящейся в недостатке, до 25.08.2020 в ПМС-99	Запрос направлен. Направлена жалоба в Брянскую прокуратуру №541 от 23.07.2020г и повторно письмо в ЛОВД по Брянску №552 от 30.07.2020г.	+
2	Устранение нарушений, выявленных центром «Желдорконтроль»	Письмо на вызов представителя ЖДК по п.13,14 (замена переходных брусьев) отправлено	+
3	Предоставить мероприятия по устранению недостатка в срок до 15 августа 2020г.	Списан с недостатка ПМГ №184 стоимостью 0,00 руб., направлен запрос №418 от 30.06.20г. в центр «Желдорконтроль» на вызов представителя для списания Здание цеха малого периодического ремонта, инв.номером 100070/2839	+
4	Главному инженеру ПМС-55 Золотухину А.Н. проанализировать причины перерасхода электроэнергии и предоставить мероприятия по снижению затрат до 01.08.2020	Проведен анализ причин перерасхода. Мероприятия по снижению затрат не предоставлены	-
5	Главному инженеру Золотухину А.Н. предоставить график по вывозу козловых кранов с базы ст.Узловая в адрес дирекции до 01 августа 2020	График предоставлен	+
6	Главному инженеру Золотухину До 15.08.2020 обеспечить списание укладочного крана УК-25/9-18 №182	Кран демонтирован. ОС-4 на подписании в ТОЦО	+
7	Обеспечить корректное отражение данных по расходу топлива на работу путевой техники в отчете ПУ-8 до 01.08.2020	Данные по расходу топлива на работу путевой техники в отчете ПУ-8 откорректированы неполностью	-

Приказ о постоянно действующей комиссии по принятию материальных отчетов

Приказ № 234/п от «06 »мая 2020 г.

Состав комиссии	Должность	ФИО
Председатель	Начальник	Трифонов С.В.
Член комиссии	Главный инженер	Золотухин А.Н.
Член комиссии	Заместитель начальника по производству	Зайцев С.В.
Член комиссии	Заместитель начальника(по стрелочным переводам)	Орослан В.Е.
Член комиссии	ведущий специалист по управлению персоналом	Сысоева Г.В.
Член комиссии	начальник производственно-технического отдела	Сысоева И.Н.
Член комиссии	начальник финансово-экономического сектора	Ростовцева А.С.

Журнал учета мест хранения МВСП, закрепленных за материально ответственным лицом

Наименование мест хранения товарно-материальных ценностей	Расположение места хранения	Материально ответственное лицо	Наименование товарно-материальных ценностей	Отметка о наличии информационной таблички (+/-)
МВСП с/годные	На территории ПМС-55/Плеханово	Булдин В.А.	МВСП с/г	+
МВСП/новые	На территории ПМС-55/Плеханово	Потапов В.В.	МВСП нов.	+
Склад База	На территории ПМС-55/Плеханово	Булдин В.А.	МВСП	+
Цех стрелочных переводов	На территории ПМС-55/Плеханово	Потапов В.В.	Стрелочные переводы	+
МВСП с/г Столбовая	На территории ПМС-55/Столбовая	Булдин В.А.	МВСП с/г	+
МВСП с/г Узловая	На территории ПМС-55/Узловая	Потапов В.В.	МВСП с/г	+
Склад КБС	На территории ПМС-55/Ефремов	Филонов Г.Ю.	МВСП, прочие ТМЦ	+
Участок Алексин	На территории ПМС-55/Алексин	Уваровский Е.С.	МВСП, прочие ТМЦ	+

Движение материалов за 7 месяцев 2020 г. (форма ФМУ-54)

№ п/п	Наименование материалов, сорт, размер	Ед. изм.	Остаток		Поступило		Израсходовано		Отражено в Р-3		Остаток	
			на начало месяца				и отпущено				на конец месяца	
			Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.	Кол-во	Сумма, руб.
1	РШР новая	км	0,777	6104319,97			0,387	3116390,3	0,387	3116390,3	0,39	2987929,67
2	РШР старогодная (перебранная)	км	12,632	60030074,5	0,444	2072611	6,517	31327184,44	6,517	31327184,44	6,559	30775501,06
3	РШР старогодная, требующая ремонта	км	22,89	38344941,69	8,453	12265469,14	2,729	4114331,55	2,729	4114331,55	28,614	46496079,28
4	Рельсовые плети новые	км нити	14,538	41210332,53							14,538	41210332,53
5	Рельсовые плети 1 группа	км нити	0	0							0	0
6	Рельсовые плети 2 группа	км нити	0	0							0	0
7	Рельсовые плети 4 группа	км нити	8,467	4502024,29			2,075	1103307	2,075	1103307	6,392	3398717,29
8	Рельсы новые	тонн	809,736	32186776,35	5,099	110355,71	182,08	7209063,99	182,08	7209063,99	632,755	25088068,07
9	Рельсы 1 группа	м	34,06	19591,46								
10	Рельсы 2 группа	м	773	478259,24	104,9	67069,01	17	10486,28			860,9	534841,97
11	Рельсы 3 группа	м	3225,322	1836466,29	32,06	20020,83	682,02	388688,63	669,06	381302,09	2588,322	1467798,49
12	Рельсы 4 группа	м	2222,76	881448,04							2222,76	881448,04
13	Шпала ж.б. новая	шт.	0	0								
14	Шпала ж.б. с/г	шт.	0	0	552	135626,4	552	135626,4	552	135626,4	0	0
15	Шпала ж.б. не годная	шт.	95487	151004	4363	6980,8	4015	6414,71	4015	6414,71	95835	151570,09
16	Шпала деревянная	шт.	36	6667,48							36	6667,48
17	щебень	м куб.	38626,06	78311419,22	2435,829	3734218,88	12707,245	25390045,96	12337,245	24650746,7	28354,644	56655592,14
18	СП ж.б. новый	комп.	24	50032310,84	5	12685072,95	5,5	5524934,81	4	9466252,27	23,5	49309814,06
19	СП ж.б. с/г (всех групп)	комп.	9,5	3247340,73	3	748020,69	6	1879916,1	6	1879916,1	6,5	2115445,32
20	СП дерево	комп	4	289193,1			4	289193,1	4	289193,1	0	0
	ИТОГО		141310,74	317632169,73	7509,79	31845445,41	18165,55	80485096,99	17781,09	83679728,65	130616,87	261079805,49

Наличие инвентарных рельсов на производственных базах и фронтах ремонта на «31» июля 2020 г.

№п/п	Местонахождения	Инвентарные рельсы в пути не накрытые плетями, км пути			Инвентарные рельсы на перегоне не собраны после смены плетей, км пути			Старогодные рельсы не вывезенные с перегона, км пути				Инвентарные рельсы на базе, км пути				Старогодные рельсы на базе, км пути				Вид ремонта	Титул (год)
		Группы			Группы			Группы				Группы				Группы					
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	База Плеханово													0,792				0,11	0,622		
2	Пер Узлов 1-3						0,41													КРС	2019 г
3	Ст. Узловая 3						1,03													КРС	2019 г
4	Ст. Бекасово18п			0,809																КРС	2019
5	Ст. Бекасово 31 п			1,107																КРС	2019
6	Пер Присады-Узловая			6,335																КРС	2020
	Итого			7,144			1,44			0				0,792				0,11	0,622		

Товарно-материальные ценности, находящиеся без движения, млн. руб. без НДС

	ВСЕГО запасы ТМЦ (по R-3)			ТМЦ без движения более 1 года									
				ИТОГО		новые МВСП		старогодные МВСП		вагонное литье		прочие материалы	
	факт на 31.07.19 (аналогичный период прошлого года)	факт на 31.07.20 (отчетный период)	откл.	31.07.20 (отчетный период)	% от общих запасов	31.07.20 (отчетный период)	% от общих запасов	31.07.20 (отчетный период)	% от общих запасов	31.07.20 (отчетный период)	% от общих запасов	31.07.20 (отчетный период)	% от общих запасов
ПМС-55	216,4	355,3	+138,9	0,002	0	0	0	0	0	0	0	0,002	0

Выполнение плана по демонтажу и разборке подлежащих списанию объектов основных средств за 7 месяцев 2020 г.

Выполнение плана по демонтажу и разборке подлежащих списанию объектов основных средств (подвижного состава, путевых машин и автотранспортных средств)								
План			Факт		+/-		%	
Кол-во, ед.		Сумма оприходования полезных остатков, млн. рублей	Кол-во, ед.	Сумма оприходования полезных остатков, млн. рублей	Кол-во, ед.	Сумма оприходования полезных остатков, млн. рублей	Кол-во, ед.	Сумма оприходования полезных остатков, млн. рублей
ПМС-55	4	1,92	4	1,95	0	0,03	0	0

Реализация металлолома									
Объем, тыс. т					Доходы, млн.рублей				Остатки лома на 31.07.20 (отчетный период)
план		факт	+/-	%	план	факт	+/-	%	тн
ПМС-55	0	0	0	0	0	0	0	0	132,3

Недостачи и потери по состоянию на «31» июля 2020 г.

актив	недостача на начало текущего года	возмещено с начало текущего года	в том числе:			выявлено в текущем году	недостача на 31.07.20				% погашения к общей сумме недостач
			возмещено материальными лицами, отнесено на виновных лиц	списано на убытки	восстановлено в учете		Всего	Всего подано в правоохранительные органы	из них находится на рассмотрении в органах полиции	отказано в рассмотрении в органах полиции	
ТМЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОС	0,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от порчи ценностей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Выполнение инвестиционной программы по балансодержателю по обновлению собственных основных фондов за 7 месяцев 2020 г.

Наименование объекта	План затрат		Факт затрат		% освоения	План ввода		Факт ввода		% ввода
	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.		ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.	
система пожарной автоматики	1	1,85	1	1,85	100	1	1,85	1	1,85	100
мобильный комплекс	1	0,96	1	0,96	100	1	0,96	1	0,96	100
сушильные шкафы	1	0,04	1	0,04	100	1	0,04	1	0,04	100
машина ВПО №39	1	143,7	1	143,7	100	1	143,7	1	143,7	100
Итого	4	146,55	4	146,55	100	4	146,55	4	146,55	100

Анализ изменения объема незавершенного строительства за 7 месяцев 2020 г., млн. рублей


	Анализ изменения НЗС за 2020 год по ДРП				в т. ч. по группе "Реконструкция и строительство ж.д. пути (титул ЦП + титул ЦУКС)"				в т. ч. по группе "Объекты строительства собственно ЦДРП"				в т. ч. по группе "Модернизация ОС и приобретение оборудования"			
	НЗС (на 01.01.20 за 2019г; расходы за 2020г)	НЗС на 31.07.20(отчетный период)	Изменение НЗС за	% вовлечение	НЗС (на 01.01.20 за 2019г; расходы за 2020г)	НЗС на 31.07.20 (отчетный период)	Изменение НЗС за	% вовлечение	НЗС (на 01.01.20 за 2019г; расходы за 2020г)	НЗС на 31.07.20 (отчетный период)	Изменение НЗС за	% вовлечение	НЗС (на 01.01.20 за 2019г; расходы за 2020г)	НЗС на 31.07.20 (отчетный период)	Изменение НЗС за	% вовлечение
2019	161,0	18,8	142,2	88	161,0	18,8	142,2	88	0	0	0	0	161,0	18,8	142,2	88
2020	370,909	34,735	336,174	10	370,909	34,735	336,174	10	0	0	0	0	370,909	34,735	336,174	10

Проверка соответствия между КС-2, ПО-13, ЕК АСУФР по капитальному ремонту пути 1 уровня (КРН) за 7 месяцев 2020г

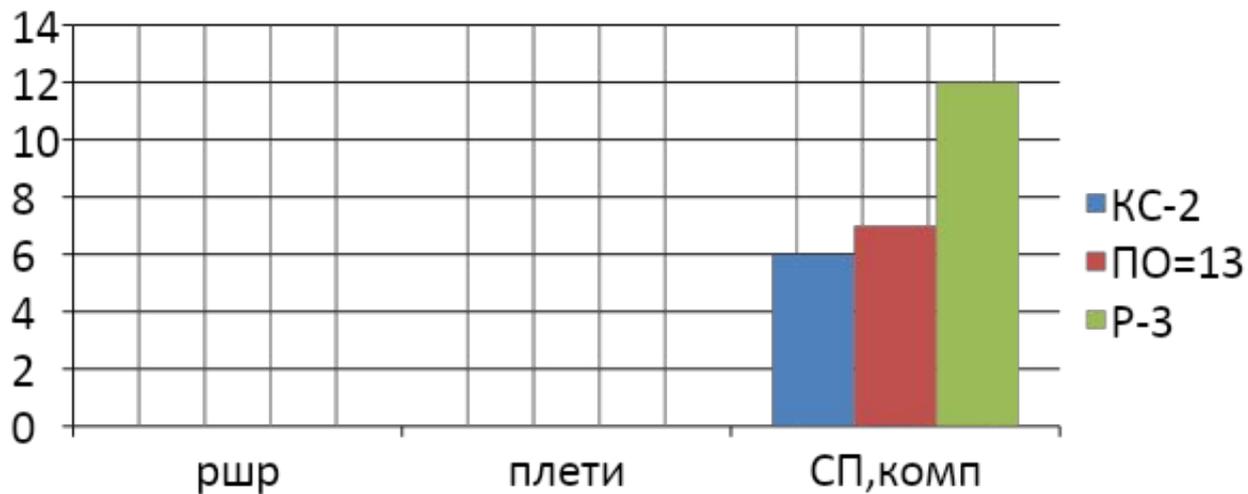


	РШР, км пути	Плети, км пути	СП, компл
КС-2	0	0	6
ПО-13	0	0	7
Р-3	0	0	12

Проверка соответствия между КС-2, ПО-13, ЕК АСУФР по капитальному ремонту пути 2 уровня (КРС) за 7 месяцев 2020г

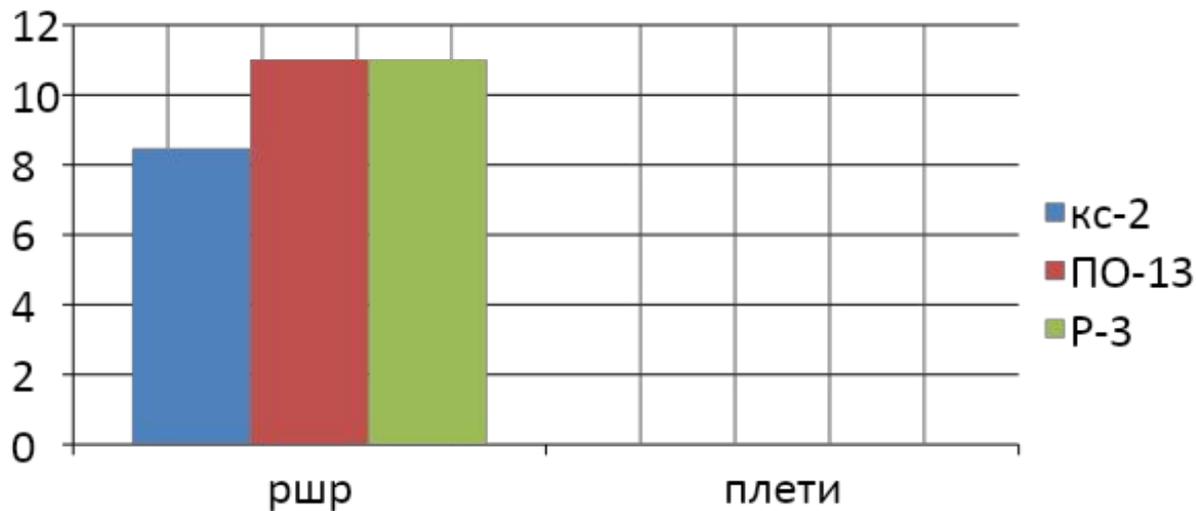


	РШР, км пути	Плети, км пути
КС-2	8,469	0
ПО-13	11,015	0
Р-3	11,015	0

Проверка соответствия между КС-2, ПО-13, ЕК АСУФР по капитальному ремонту РС и СП за 7 месяцев 2020г

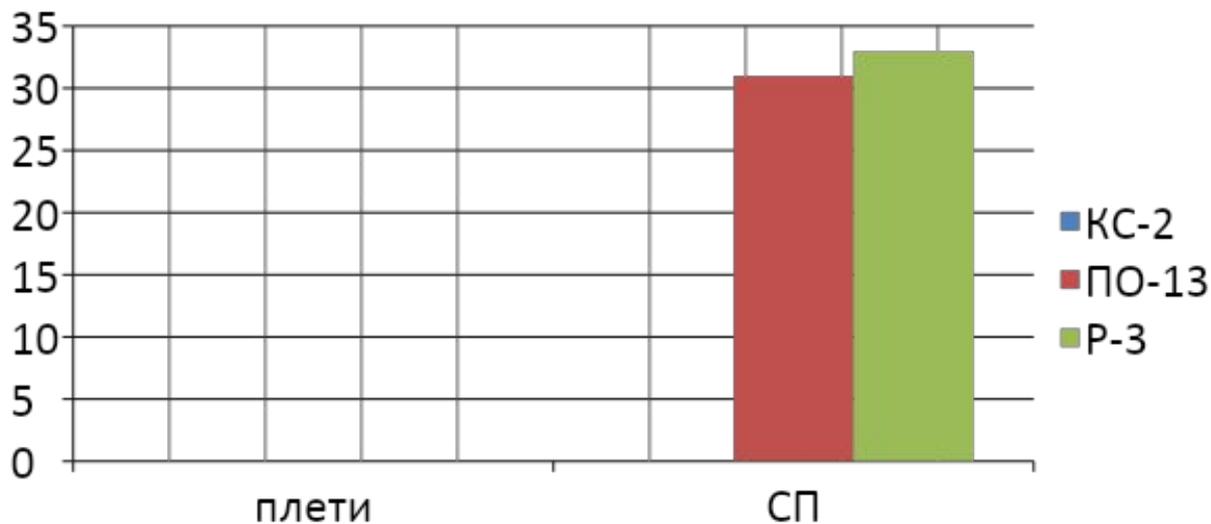


	Плети, км пути	СП, компл
КС-2	0	0
ПО-13	0	36
Р-3	0	33

Проверка соответствия между КС-2, ПО-13, ЕК АСУФР по капитальному ремонту пути титула ЦУКС (Н-3) за месяца 2020г



	РШР, км пути	Плети, км пути	СП, компл
КС-2	0	0	0
ПО-13	0	0	0
R-3	0	0	0

Проверка соответствия между КС-2, ПО-13, ЕК АСУФР по капитальному ремонту пути титула ЦУКС (ПВД) за месяца 2020г

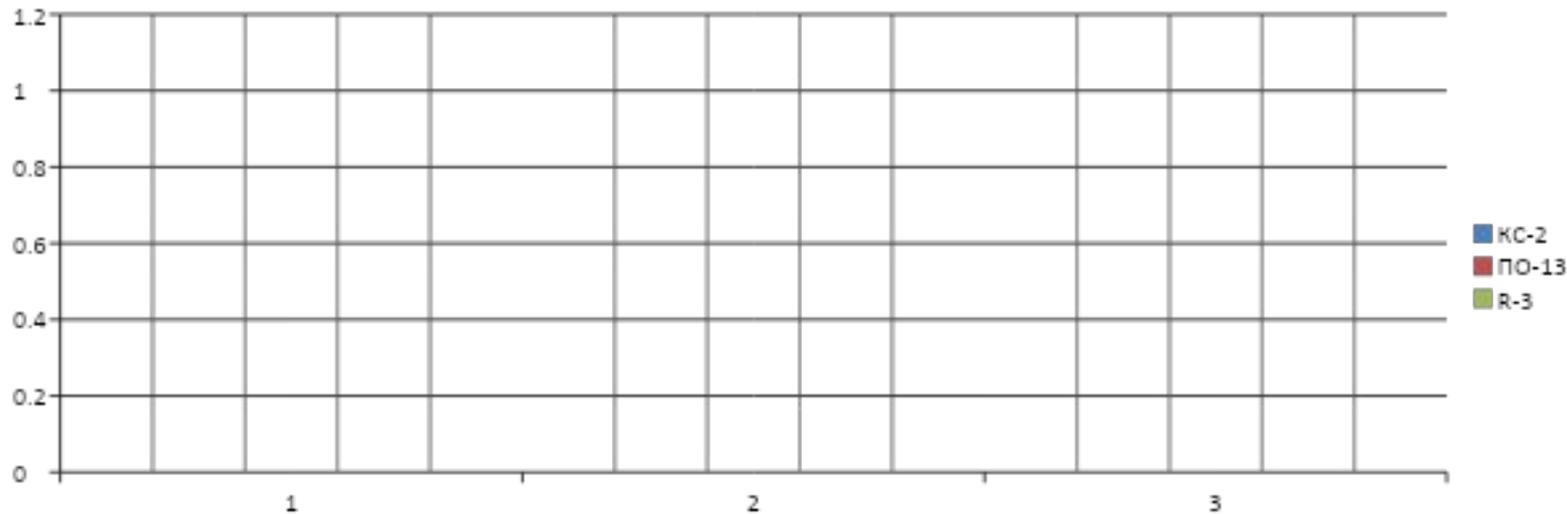

	РШР, км пути	Плети, км пути	СП, компл
КС-2	0	0	0
ПО-13	0	0	0
R-3	0	0	0

Вопросы в ходе сдачи материальных отчётов за июль месяц 2020 г.

№	Ответственный отдел	Вопросы и замечания, меры по решению проблемных вопросов
1	Начальник производственного участка Уваровскому	Сформировать заявку в ООО ТрансЛом на отгрузку лома от разделки ОС до 10.09.2020
2	Главному инженеру Золотухину А.Н.	Составить нормы расхода топлива на Мобильный комплекс до 01.09.2020
3	Зам.нач.по производству Зайцев С.В Орослану В.Е.	Заместителю начальника Зайцеву С.В., Заместителю начальника Орослану В.Е. вывезти МВСП с перегонов до 01.09.2020г.
4	Начальник производственного участка Уваровскому	Отгрузить рельсы 2 группы со ст. Средняя на ст. Плеханово до 01.10.2020
5	Зам.нач.по производству Зайцев С.В.	Заместителю начальника Зайцеву С.В. До 01.09.2020г.подготовить график вывоза материалов повторного использования, находящихся на перегонах.
6	Зам.нач.по производству Зайцев С.В.	Заместителю начальника Зайцеву С.В. До 01.09.2020г. предоставить первичные учетные документы на передачу в ПМС-68 8 комплектов АПАТЭК
7	Главному инженеру Золотухину А.Н.	Проанализировать причины перерасхода ТЭР и составить мероприятия по их снижению на 2 полугодие до 01.09.2020
8	Главному механику Сорочихину А.Н.	Обеспечить корректное отражение данных по списанию топлива в отчете ПУ-8
