



Маріупольська
міська рада

Підготовка к зимньому періоду 2018-2019 года ККП «Маріупольтеплосеть» на 2018 год

Директор Мирошніченко Дмитрій Николаевич

2018



Маріупольське
тепло



**ККП
"Мариупольтеплосеть"
эксплуатирует
66 котельных в т.ч.:**
газовых – 61;
твердотопливных – 5.

Предприятие эксплуатирует:
- 59 ЦТП (центральный тепловой пункт);
- 3 ОДП(объединенный диспетчерский пункт);
- 16 ТП (тепловых пунктов)
- 29 бойлерных;
- 1 насосную.

Общая протяженность тепловых сетей – 951,957 пкм в однострубно́м исчислении, из них:
- **280,573** пкм сетей горячего водоснабжения
- **671,384** пкм сетей отопления

На отопительный период штатная численность составляет 1402 шт. ед. (из них 493 шт.ед. сезонный персонал)

Общее количество техники на предприятии – 117 единиц/106 в эксплуатации.

Кол-во вакантных штатных единиц- 66

Котельные предприятия обеспечивают теплоснабжением **2511 объекта**, общей площадью **7584,54 тыс. м².**, из них **1887 жилых домов.**

Количество л/счетов:
-население **128620**;
-бюджет и прочие **2522**.

Обслуживает:
- **244396** абонентов населения, в том числе с г/в - **193760**.

Тариф для населения: с НДС
- ЦО (с тепломером) – 1300,49 грн. за 1 Гкал;
- ЦО (без тепломера) - 31,07 грн. за 1 м²;
- горячая вода 74,01 грн. за 1 м³.
Тариф для бюджета и прочих (предприятий): с НДС
- ЦО - 1843,16 грн. за 1 Гкал;
горячая вода 100,43 грн. за 1 м³
Цена газа для населения **6809,64** грн с НДС
Для предприятий **10367,88** грн с НДС



Подготовка ККП «Мариупольтеплосеть» г. Мариуполя к отопительному периоду 2018-2019 гг.


При подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг. предприятие «Мариупольтеплосеть» выполнило следующие работы:

Основные мероприятия	Отопительный сезон 2017-2018 гг.	План 2018-2019гг.	Факт по состоянию на 23.10.2018г.	% выполнения
-подготовка котельных (66 – на балансе ККП «Мариупольтеплосеть»), ед.	66	66	66	100
- подготовка ЦТП, ед.	59	59	59	100
- запорная арматура, в т.ч. замена, ревизия	2300 259 2041	2096	2096 261 1835	100
Восстановление изоляции теплотрасс – 4549 м. - насосное оборудование, в т.ч. замена, ревизия	247 27 220	265	265 14 251	100



Выполнение работ	Факт 2016, км	Факт 2017, км	План 2018, км	Факт 2018, км
Замена тепловых сетей	14,889	17,521	50	53
Техническое обслуживание	15,811	22,479		
Всего:	30,7	40	50	53

Замена тепловых сетей, км в год

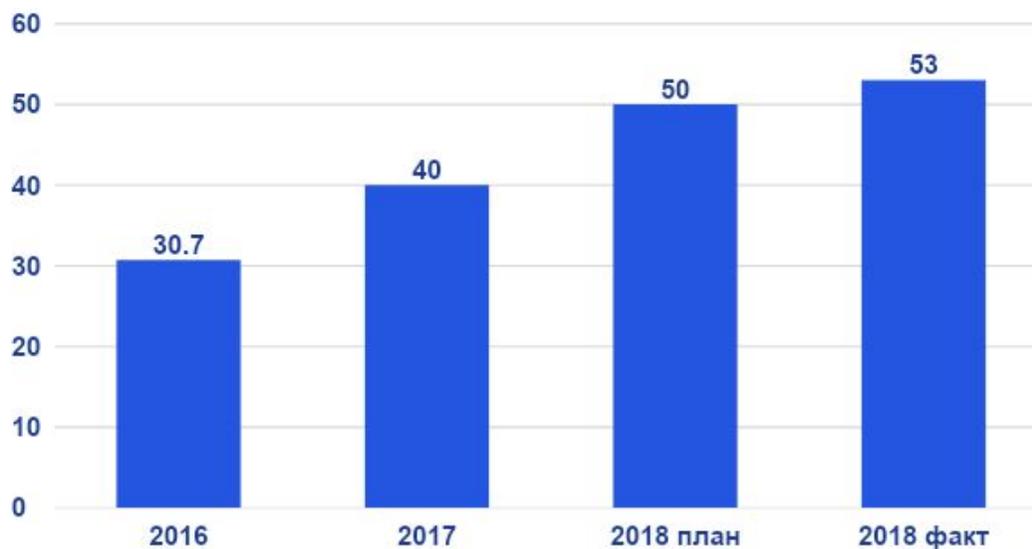



Теплофикационный район	План, мп.	Факт, мп.	% выполнения
Центральный	2362,0	1 677,0	71
Кальмиусский	4186,2	4 002,3	95,6
Приморский	3625,8	2 999,9	82,74
Левобережный	1795,3	1 590,8	88,6
Всего:	11969,3	10 270	85,8

Вопрос состояния изоляции всех надземных теплотрасс находится на ежедневном контроле ККП «Маріупольтеплосеть»

Всего в 2018 году планируется восстановить 11,9 км изоляции наземных сетей. Работы выполняются согласно графика и по состоянию на 23.10.2018 восстановлено – **10 270 мп (76%)**.



Маріупольське
тепло

Финансирование предприятия для подготовки к осенне-зимнему периоду



Реконструкция котельной
водогрейного котла ПТВМ-50 №2
в котельной
ул. Новотрубная, 27



6 955,00
тыс.грн



Реконструкция котельной д/у №52
по ул. Ушакова, 85 с заменой
котлов на высокоэффективные с
КПД не ниже 91%



1 300,00
тыс.грн



Закупка материалов (трубы и др.)
для проведения ремонтов



15 568,181
тыс.грн

**Спасибо за
внимание**



**Маріупольська
міська рада**
