



Создание Волейбольного центра и 5 модульных спортивных площадок с цифровой инфраструктурой по ФП «Бизнес- спринт»

Доклад министра спорта и молодежной политики Козырева И.В.





Проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация и техническое обслуживание Физкультурно-оздоровительного комплекса в 103 мкр. (2 очередь)».

Общий бюджет
проекта:

260 629,36 тыс. руб.

(по заключению экспертизы
от 21.12.2023 г.)

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

195 000,00 тыс.руб.

(ФБ – 183 064,1 тыс. руб.,

РБ – 11 684,94 тыс. руб.,

МБ – 250,96 тыс. руб.)

Кассовое освоение – 100%.

Средства инвестора – 43 833,13
тыс. руб.

Инвестор: ООО «Центр волейбола Эйс»



Сроки реализации проекта: 2023 – 2037 гг.



Проектирование, строительство, финансирование, эксплуатация и техническое обслуживание Физкультурно-оздоровительного комплекса в 103 мкр. (2 очередь)».



Строительная готовность - 60 %.

Выполнено: котлован, устройство фундамента, обратная засыпка, подпорная стенка - 100 %.

Элементы металлического каркаса: колонны, фермы, связи изготовлены в полном объеме. Тепловой контур закрыт, осуществлено утепление наружных стен и монтаж окон.

Для завершения строительно-монтажных работ на объекте необходимо + сроки готовности:

На объекте ведется монтаж наружных панелей, количество рабочих - 27 рабочих.

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ



Финансирование, проектирование, строительство, оснащение, техническое обслуживание и эксплуатация объектов физической культуры и спорта – 5 модульных спортивных плоскостных площадок капитального типа для массового спорта с цифровой инфраструктурой в Республике Бурятия

Общий бюджет проекта:

406 640,52 тыс. руб.

ФБ – 347 025,57 тыс. руб.,

РБ – 22 150,57 тыс. руб.

Средства инвестора – 37 464,38 тыс. руб.

Инвестор: ООО «Национальные Технологии»

Общая стоимость создания 5 объектов – 406 640,52 тыс. руб.


1. Модульная спортивная площадка капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, территория парка им. С.Н. Орешкова, стоимостью - **142 046, 21 тыс.руб.**
2. Модульная спортивная площадка капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой в Республике Бурятия, р-н Селенгинский, г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, «Парк культуры и отдыха», стоимостью - **74 267,16 тыс.руб.**
3. Модульная спортивная площадка капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой в Республике Бурятия, р-н Иволгинский, с. Гурульба, д. 26А, стоимостью – **83 425, 89 тыс.руб.**
4. Модульная спортивная площадка капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, вблизи ПКиО «Юбилейный», стоимостью - **49 350, 38 тыс.руб.**
5. Модульная спортивная площадка капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой в Республике Бурятия, р-н Тункинский, п. Аршан, ул. Тракторная - **57 550, 88 тыс.руб.**



Сроки реализации проекта: 2023 – 2028 гг.



Модульная спортивная площадка капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, вблизи ПКиО «Юбилейный», стоимостью - 49 350, 38 тыс.руб.

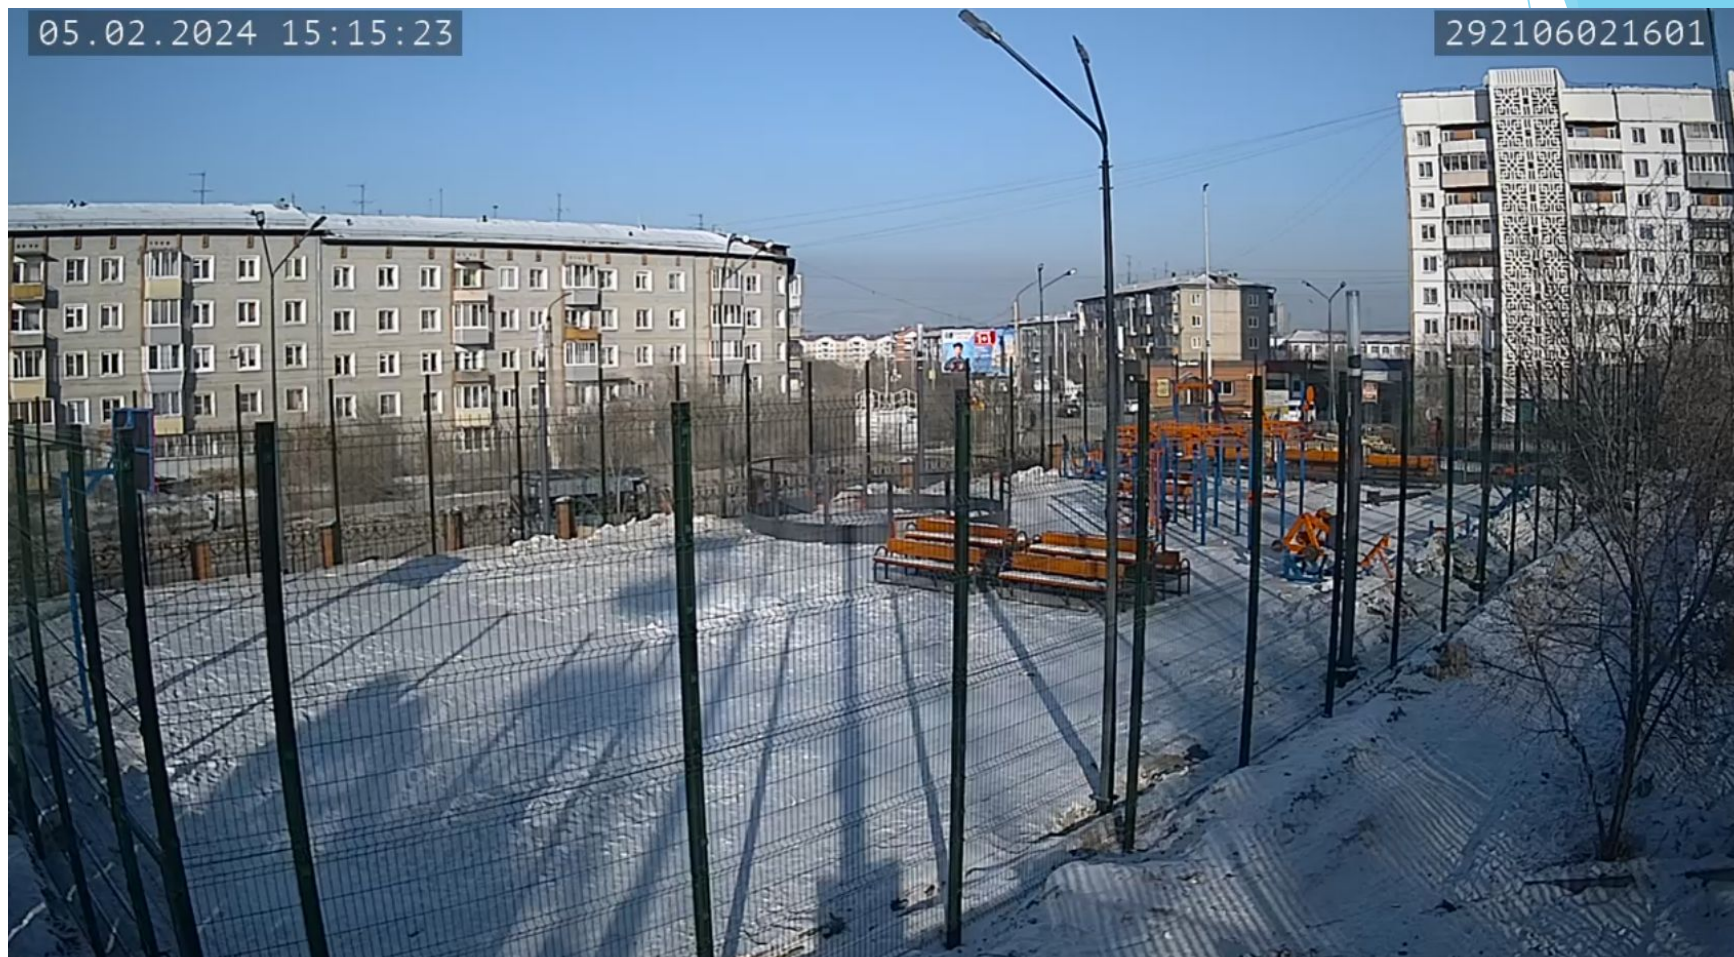

Строительная готовность - 100 %. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.01.2024 № 03-24-03-2024.

В рамках гарантийных обязательств без осуществления этапа «Благоустройство». **Срок исполнения этапа «Благоустройство» - 30.06.2024.**

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ



Модульная спортивная площадка капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой в Республике Бурятия, р-н Тункинский, п. Аршан, ул. Трактовая - 57 550, 88 тыс.руб.



Строительная готовность - 99 %.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на оформлении.
В рамках гарантийных обязательств без осуществления этапа «Благоустройство».

Срок исполнения этапа «Благоустройство» - 30.06.2024.



**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ



Модульная спортивная площадка капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой в Республике Бурятия, р-н Иволгинский, с. Гурульба, д. 26А, стоимостью – 83 425, 89 тыс.руб.



Строительная готовность - 80 %. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, электромонтаж и монтаж вентиляции.

Для завершения строительно-монтажных работ на объекте необходимо:

- завершить отделочные работы - 28.02.2024.;
- Осуществить присоединение к сетям энергоснабжающих организаций - 20.02.2024.;

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**


Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ



Модульная спортивная площадка капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой в Республике Бурятия, р-н Селенгинский, г. Гусиноозерск, ул. Комсомольская, «Парк культуры и отдыха», стоимостью - 74 267,16 тыс.руб.

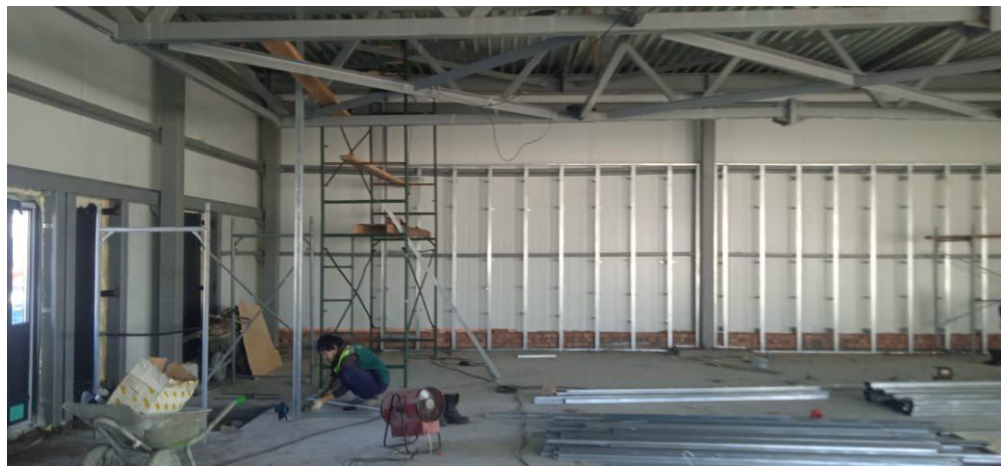

Строительная готовность - 70 %.

В настоящее время ведется монтаж металлоконструкций и ограждения площадки, отделочные работы, монтаж инженерных сетей.

Для завершения строительно-монтажных работ на объекте необходимо:

- завершить отделочные работы, монтаж

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**


Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ



Модульная спортивная площадка капитального типа для занятий массовыми видами спорта с цифровой инфраструктурой по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, территория парка им. С.Н. Орешкова, стоимостью - 142 046, 21 тыс.руб.

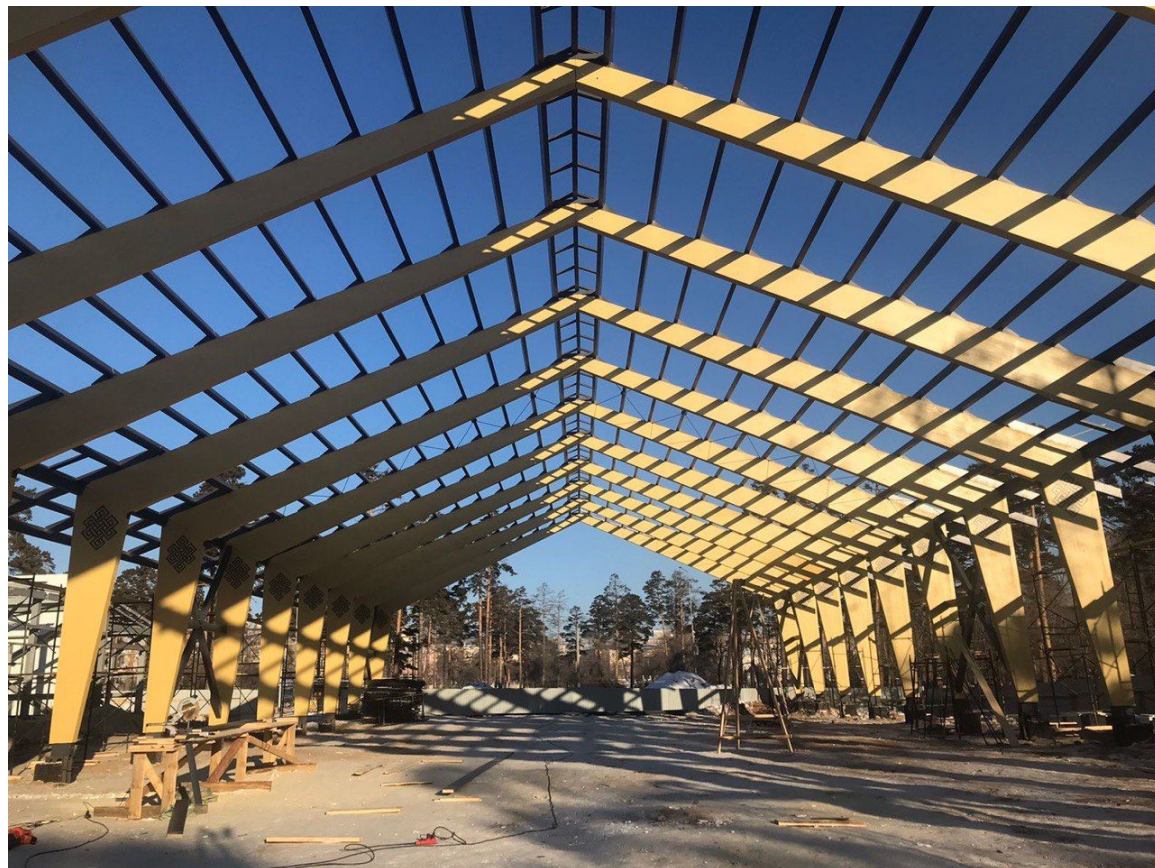

Строительная готовность - 40 %.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в срок до 30.03.2024 г. без осуществления этапа «Благоустройство».

Для завершения строительно-монтажных работ на объекте необходимо:

- Закрывать тепловой контур АДЦ - 25.02.2024.;



**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

**БИЗНЕС
СПРИНТ**

Я ВЫБИРАЮ →
СПОРТ

Спасибо за внимание!

