

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ

Подрядная организация:

- **ООО
«КубаньПолимерГаз»**

Период наблюдений:

- **с 1.09.23 по 10.11.23**

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

- **Отсутствие вовлеченности и системности** в процесс контроля и обеспечения оперативной безопасности на объектах со стороны ИТР (вопросы своевременной замены СИЗ, инструментов, подготовки площадки к работам, устройства откосов траншей и безопасного складирования ТМЦ).
- **Отсутствие ответственности со стороны рабочих к собственной безопасности**, несмотря на регулярные разъяснения, инструктажи, обучение, взыскания и штрафы. Небрежное отношение к выданным СИЗ.
- **Отсутствие в компании структуры по вопросам ОТ и ТБ.**

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ:

- Проведено общее собрание с рабочим коллективом на предмет «проседания» в вопросах ТБ;
- Проведен внеплановый инструктаж;
- Вынесены штрафные санкции «стабильным» нарушителям из числа рабочих- 4 чел.
- Уволены ИТР за систематическое допущение нарушений – 2 чел.
- Заключен договор на проведение аудита состояния дел по ОТ и ТБ в ООО «КубаньПолимерГаз»;

ПРОВЕДЕН АНАЛИЗ ХАРАКТЕРА НАРУШЕНИЙ:


- 1. Ограждение и знаки – 23%**
- 2. Складирование ТМЦ – 30%**
- 3. СИЗ , неисправный инструмент – 17%**
- 4. Работа в ОЗП -15%**
- 5. Прочие – 15%**

**ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ИХ
УСТРАНЕНИЮ:**

**ФОТООТЧЕТ
ОБ УСТРАНЕНИИ
ЗАМЕЧАНИЙ**

1. ОГРАЖДЕНИЕ И ЗНАКИ

Замечания

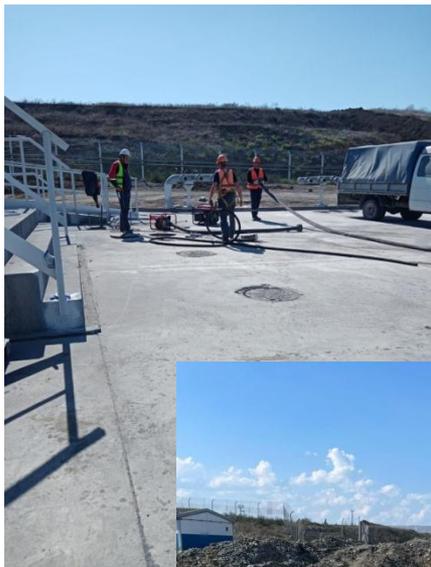


Устранение



2. СКЛАДИРОВАНИЕ ТМЦ на строительной площадке

устранени
е

Замечания

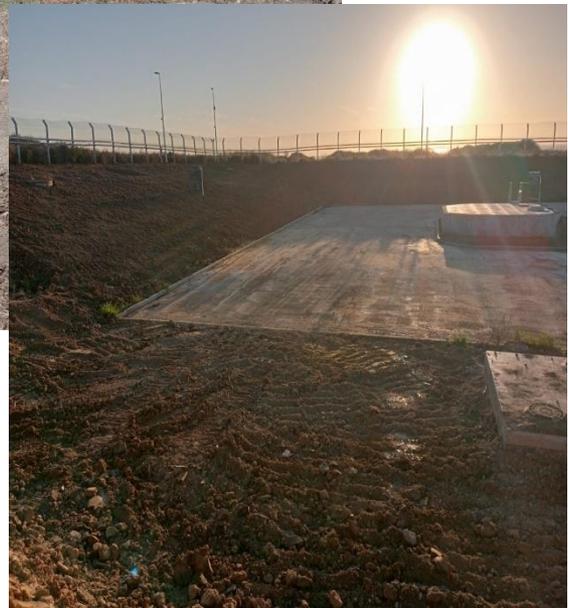

на площадке базирования ООО «КПГ»

Замечание:

нарушение порядка складирования и хранения ТМЦ




Устранение

ТМЦ складированы на поддоны в закрытые склады.
Трубы и ЖБИ на подложках.



Устранение

ТМЦ складированы на поддоны под навесы.
Остатки ПЭ И ПП труб утилизируются

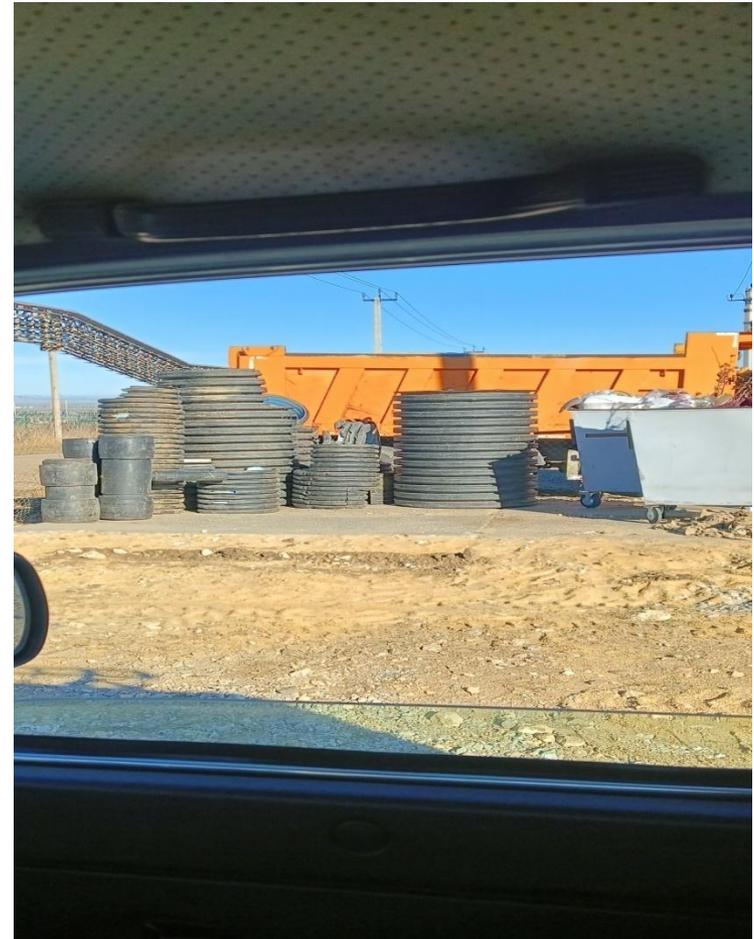

возле инструментальных контейнеров на территории «ОТЭКО-Портсервис»

Замечание:

Беспорядочное мусор.



Устранение

Наведен порядок. Вывезен



3. СИЗ, инструменты

Замечания:
не используются подбородочные ремешки
инструктаж



Реагирование:
проведен



**Самодельный
инструмент**



**ИЗЪЯТ И
УТИЛИЗРОВАН!!!**

Замечание

**Непригодна страховочная
новые
привязь пояса**



Устранение приобретены



4. Работа в колодцах (ОЗП)

Замечания:

1. Отсутствие обучений персонала для работы в ОЗП;
2. Недостаточное раскрытие защитных мероприятий в нарядах-допусках;
3. Не проводится замер загазованности в колодцах перед началом работ;

Устранение:

1. Организовано и проведено обучение сотрудников выполняющих работы в колодцах (ОЗП) – 11 человек;



2. Мероприятия в нарядах-допусках прописаны в полном объеме.

к «Положению об организации работ с повышенной опасностью в ООО «ОТЭКО-Портсервис»

Приложение №4

НАРЯД-ДОПУСК НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ № 80/23

ООО «КубаньПолимерГаз»

1. НАРЯД

1.1 Производитель работ прораб Шалимов С.М.
(должность, наименование подразделения, подпись)

с бригадой в составе _____ человек поручается произвести следующие работы: Выполнение мероприятий по выносу и защите сетей НВ в районе ПС14.14. Демонтаж дорожной одежды. Устройство траншей глубиной от 2 до 3 м. Демонтаж существующих сетей водопровода. Перенос ЖБИ колодцев. Устройство футляров. Обратный монтаж сетей. ~~Обратная засыпка выноса грунта.~~ Титул С 2.1.11.14 и С2.8.2. (штаб АБК).

1.2 При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности:
Огородить место проведения работ, очистить от строительного мусора место проведение работ в радиусе 12 метров. Выставить знаки. Проверить средства коллективной и индивидуальной защиты: спецодежда, каска, спец обувь, рукавицы (перчатки), монтажные пояса. Перед опуском персонала в колодец ЖБИ диаметром 2м и рабочей глубиной 1,8 м, выполнить замеры загазованности. При необходимости выполнить вентиляцию в колодце приточно-вытяжным вентилятором. Обеспечить на каждого работающего в колодце двух рабочих наверху для страховки с наветренной стороны. Убедиться в отсутствии воды в колодце. При необходимости откачать воду. В процессе работы контролировать уровень воды в колодце. Перед началом работ проверить целостность стропов, оборудования, проводов электроинструмента и переносок. При разработке траншеи обеспечить проектные откосы. Очистить верхнюю часть бермы от больших камней и земли. При невозможности устройства откосов, выполнить раскрепление стенок траншеи щитами. При невозможности раскрепления щитами работы не выполнять до принятия решения об их укреплении. При работе экскаватора обеспечить безопасное расстояние на вылет стрелы + 5 м. Перед демонтажом сетей убедиться в их отключении от общей сети и опорожнении. Контролировать уровень воды в котловане. При необходимости воду откачать. Верхнюю площадку откосов очистить от камней и кусков земли для исключения их падения в котлован. Постоянно контролировать передвижение строительной спецтехники и автотранспорта. При сварке трубопровода ПЭ (оборудование в комплекте от Д-225мм до Д-400мм согласно перечня оборудования на перемещение). Опуск рабочих в траншею осуществлять по инвентарным лестницам с предварительной проверкой ее целостности и назначении страхующего. При работе генератора выполнить его заземление и подвешивание кабелей с предварительной проверкой целостности изоляции проводов. Не производить работы в отсутствие ответственного за производство работ или ответственного лица, назначенного расценодающим. Не допускать на место проведения работ людей, не связанных с проведением работ по наряду-допуску. Соблюдать режим труда и отдыха. По окончании работ, ответственный за производство работ, обязан организовать уборку рабочего места и обеспечить его безопасное и чистое состояние.

1.3 Начать работы: в 8 час. 00мин. «02» 11 2023г.

1.4 Окончить работы: в 17 час. 00мин. «30» 11 2023г.

1.5 Наряд выдал руководитель работ: заместитель директора Толстых Е.В.
(наименование должности, фамилия и инициалы, подпись)

1.6 С условиями работ ознакомлены:
Производитель работ: «08» 11 2023г. Шалимов С.М.
(подпись) (фамилия и инициалы)

Допускающий: _____ 2023 г. _____
(подпись) (фамилия и инициалы)

2. Допуск

2.1 Инструктаж по охране труда в объеме инструкций:

«Положение об организации работ с повышенной опасностью» Версия документа: 1.0
в ООО «ОТЭКО-Портсервис»

3. **В качестве компенсирующих мероприятий проводится принудительная вентиляция колодцев с использованием вентилятора ВСП-500/220/12.**

Достигнута договоренность с эксплуатацией о выполнении замеров газоанализатором по нашим заявкам.



5.ПРОЧИЕ:

Замечания

- Неисправность спецтехники;
- Неправильность заполнения путевых листов;
- Отсутствие ИТР на месте производства работ;
- Нахождение персонала в опасной зоне экскаватора.

Устранение

- Выведено в ремонт – 2 единицы техники; Проводится поэтапное обновление парка спецтехники и средств малой механизации;
- Усилен контроль за оформлением путевых листов;
- Проведены разъяснительные беседы и инструктажи;
- Применяются штрафные санкции к нарушителям.
