



**Фото не устраненных замечаний
специалистов АН
по строительству объекта «ПК "Шесхарис". ПП
"Грушовая».
Строительство резервуаров РВС (П)-30000 м³.
Резервуар № 9, 10, 11, 12, 13, 14»**

26 августа 2019 года

Фото не устраненных замечаний

2

ПК "Шесхарис". ПП "Грушовая».
Строительство резервуаров РВС
(П)-30000 м³. Резервуар № 9,
10, 11, 12, 13, 14"



Фото по состоянию на 26.08.2019

Проведена проверка работ по монтажу стоек кабельной эстакады на подпорной стенке РВСП 11, РВСП 13. Выявлено: длина анкерных болтов не позволяет установить контргайку. Нарушение РД Г.4.0000.19004-ЧТН/ГТП/2-00.205-АС лист 30, 35; ГОСТ 24379.1-2012.

Дата выявления - 03.06.2019

Устранить до 02.08.2019



*Авторский надзор:
Инженер 1 категории ОАН ОмскГТП
Желнин Александр Константинович
сот.8-913-664-1808*

Фото не устраненных замечаний

3

ПК "Шесхарис". ПП "Грушовая».
Строительство резервуаров РВС
(П)-30000 м3. Резервуар № 9,
10, 11, 12, 13, 14"



Фото по-прежнему на 27.06.2019

Проведена проверка работ по сборке металлоконструкций прожекторной мачты 219.5. Выявлено: в односрезных соединениях головки болтов устанавливаются со стороны более толстых элементов, пружинные шайбы устанавливаются совместно с круглыми шайбами. Нарушение Г.4.0000.19004-ЧТН/ГТП/1-00.219.4-6-КМ лист 1; СП 70.13330 п.4.5.5.

Дата выявления - 03.06.2019


Устранить до 02.08.2019

*Авторский надзор:
Инженер 1 категории ОАН ОмскГТП
Желнин Александр Константинович
сот.8-913-664-1808*

Фото не устраненных замечаний

4

ПК "Шесхарис". ПП "Грушовая».
Строительство резервуаров РВС
(П)-30000 м3. Резервуар № 9,
10, 11, 12, 13, 14"

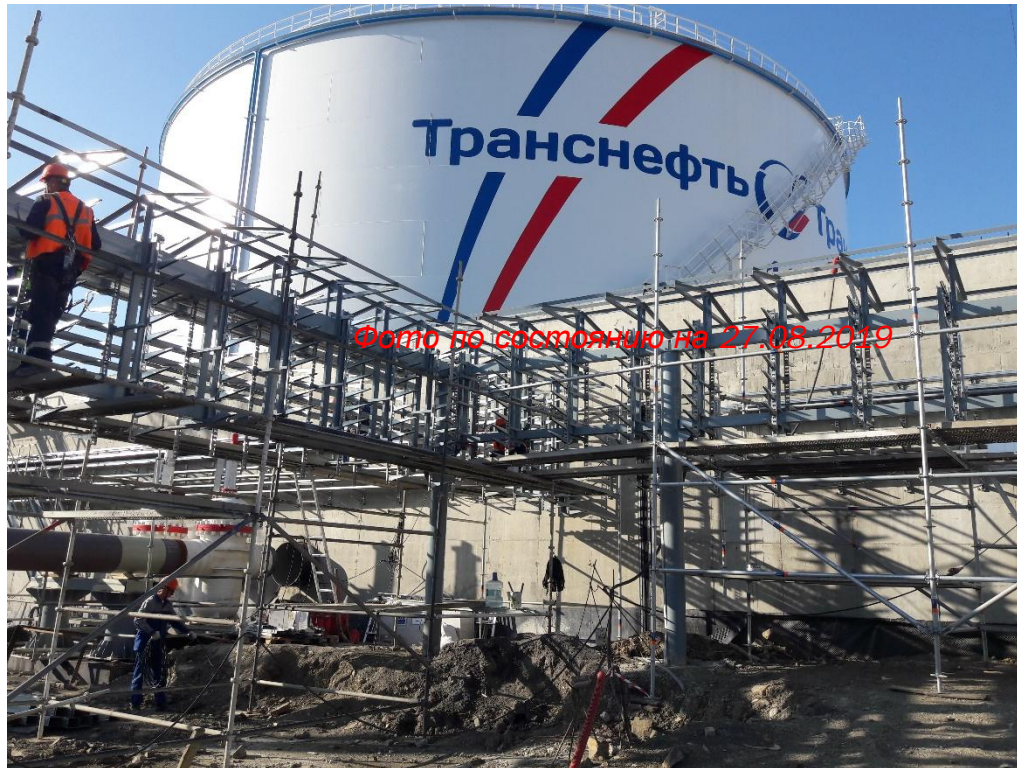

Проведена проверка исполнительной документации по монтажу кабельной эстакады 2 этап. Выявлено: отметка верха стоек между точками 2.1 - 2.2 не соответствует проекту (занижена на 0,6 м). Нарушение Г.4.0000.19004-ЧТН/ГТП/2-00.205-АС лист 4.

Дата выявления - 06.08.2019

Устранить до 06.09.2019

*Авторский надзор:
Инженер 1 категории ОАН ОмскГТП
Желнин Александр Константинович
сот.8-913-664-1808*

Фото не устраненных замечаний

5

ПК "Шесхарис". ПП "Грушовая».
Строительство резервуаров РВС
(П)-30000 м3. Резервуар № 9,
10, 11, 12, 13, 14"



Фото по состоянию на 27.08.2019

Проведена проверка работ по устройству ограждения вокруг площадки резервуара противопожарного запаса воды. Выявлено: производится монтаж, укладка и засыпка противопожарной трубы, не выполнено покрытие резино-битумной мастикой, не произведен монтаж упоров. Нарушение Г.4.0000.19004-ЧТН/ГТП/2-00.602-АС лист 3, письмо ф-ла "ОГТП" 12.07.2019 № ГТП-140-306-16/73829.

Дата выявления - 12.08.2019

Устранить до 02.09.2019

*Авторский надзор:
Инженер 1 категории ОАН ОмскГТП
Желнин Александр Константинович
сот.8-913-664-1808*

Фото не устраненных замечаний

6

ПК "Шесхарис". ПП "Грушовая».
Строительство резервуаров РВС
(П)-30000 м3. Резервуар № 9,
10, 11, 12, 13, 14"



Фото по состоянию на 27.08.2019

Проведена проверка работ по монтажу лотка кабельного по стенке каре 1 этап. Выявлено: до монтажа лотка не выполнено заполнение деформационного шва стенки, не установлена гидрошпонка. Нарушение Г.4.0000.19004-ЧТН/ГТП/1-00.780.1-АС лист 4.

Дата выявления - 13.08.2019

Устранить до 09.09.2019

*Авторский надзор:
Инженер 1 категории ОАН ОмскГТП
Желнин Александр Константинович
сот.8-913-664-1808*

Фото не устраненных замечаний

7

ПК "Шесхарис". ПП "Грушовая».
Строительство резервуаров РВС
(П)-30000 м3. Резервуар № 9,
10, 11, 12, 13, 14"



Проведена проверка работ по монтажу металлоконструкций ограждения на площадке резервуара противопожарного запаса воды. Выявлено: разность отметок верха смежных панелей более 100 мм. Нарушение РД-13.310.00-КТН-178-17 п 6.2.28.

Дата выявления - 16.08.2019

Устранить до 09.09.2019

*Авторский надзор:
Инженер 1 категории ОАН ОмскГТП
Желнин Александр Константинович
сот.8-913-664-1808*

Фото не устраненных замечаний

8

ПК "Шесхарис". ПП "Грушовая».
Строительство резервуаров РВС
(П)-30000 м3. Резервуар № 9,
10, 11, 12, 13, 14"



Фото по состоянию на 27.08.2019

Проведена проверка работ по устройству покрытия из дорожных плит ПДН в координатах 2А/2Б+80 - 2А+20/3Б+10. Выявлено: схема раскладки плит не соответствует проекту - выполнены разрывы между плит. Нарушение Г.4.0000.19004-ЧТН/ГТП/1-00.100.9-10-ГП лист 6.

Дата выявления - 19.08.2019

Устранить до 30.09.2019

*Авторский надзор:
Инженер 1 категории ОАН ОмскГТП
Желнин Александр Константинович
сот.8-913-664-1808*

Фото не устраненных замечаний

9

ПК "Шесхарис". ПП "Грушовая». Строительство резервуаров РВС (П)-30000 м3. Резервуар № 9, 10, 11, 12, 13, 14"



Фото по состоянию на 27.08.2019



Проведена проверка работ по ремонту водоотводного коллектора, проложенного под технологической полкой (проект филиала "КГТП" "ПК Шесхарис" Инженерная защита. Реконструкция"). Выявлено: нарушена технологическая последовательность - извлечена разрушенная секция коллектора до установки защитного футляра из трубы диаметром 1500. Нарушение требований акта осмотра водоотводного коллектора от 05.08.2019

Дата выявления - 20.08.2019

Устранить до 30.09.2019

*Авторский надзор:
Инженер 1 категории ОАН ОмскГТП
Желнин Александр Константинович
сот.8-913-664-1808*
