



## Нарушения

1. При производстве работ экскаватором, персонал находится в опасной зоне.
2. Экскаватор применяется не по назначению, производится перемещение труб при помощи ковша экскаватора, который конструктивно не предназначен для данных операций.
3. Отсутствует лестница для спуска и подъема из траншеи.
4. Грунт размещается на расстоянии менее 0,5 м от края траншеи.
5. Не весь персонал при производстве работ использует защитные каски.

## Мероприятия по недопущению

1. Предоставить приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц подрядной организации.  
Ответственный – начальник УКС  
Срок: до 11.08.2017
2. Инициировать применение штрафных санкций в отношении ООО «РОС-НИВА+».  
Ответственный – начальник УКС  
Срок: до 22.08.2017

Куратор – Ведущий инженер УКС  
Фатнев А.А.



## Нарушения

1. Не проведен пусковой аудит.
2. Персонал производит работы без полного комплекта СИЗ.
3. У прораба отсутствуют подтверждающие документы по аттестации (НАКС).
4. На месте производства огневых работ отсутствуют первичные средства пожаротушения.

Работы приостановлены до устранения нарушений

## Мероприятия по недопущению

1. Предоставить приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц подрядной организации.  
Ответственный – начальник УКС  
Срок: до 11.08.2017
2. Инициировать применение штрафных санкций в отношении ООО «Нефтегазстрой Инжиниринг»  
Ответственный – начальник УКС  
Срок: до 22.08.2017

Куратор – Ведущий инженер УКС  
Щекаев А.В.



## Нарушения


1. Допускается использование погрузчика не по назначению (подъем трубы).
2. Монтажник не использует страховочную привязь.

## Мероприятия по недопущению

1. Предоставить приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц подрядной организации.  
Ответственный – начальник УКС  
Срок: до 11.08.2017
2. Инициировать применение штрафных санкций в отношении ООО «Тольятти Энергоремонт».  
Ответственный – начальник УКС  
Срок: до 22.08.2017

Куратор – Ведущий инженер УКС  
Руднев А.В.



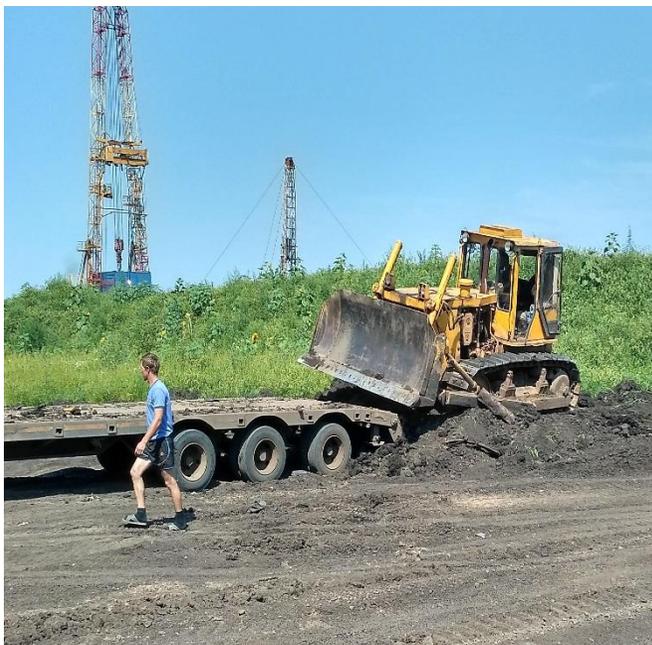

## Нарушения

1. Разгрузка бульдозера осуществляется без сходней.
2. Во время съезда бульдозера дверь кабины была открыта.
3. Машинист бульдозера не был пристегнут ремнем безопасности.
4. Водитель тягача не обеспечен СИЗ.

### УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ПРОИСШЕСТВИЯ № 305-К-1-Рид-16.02.2017

<p><b>Дата происшествия:</b> 16.02.2017  <b>Общество Группы:</b> АО «Самаранефтегаз»  <b>Место происшествия:</b> Самарская область, Нефтегорский район, скважина №227 Верхне-Ветлянского месторождения.  <b>Уровень происшествия:</b> Происшествия уровня «К».  <b>Вид происшествия:</b> НС со смертельным исходом.</p> <p><b>Краткое описание происшествия:</b>                  В 17 часов 30 минут местного времени машинист бульдозера принадлежащего субподрядной организации ООО «ГеоЛад-СТ Поволье» оказывающей транспортные услуги ООО «Вела-Петролеум», производил погрузку бульдозера Т-170 на трейлер (не оборудованного откидными мостами) на базе автомобиля КамАЗ, принадлежащего ООО «Вела-Петролеум». Работы выполнялись в 100 метрах от устья скважины №227 Верхне-Ветлянского месторождения.                  При заезде бульдозера на трейлер произошло опрокидывание бульдозера на бок, в результате чего машинист бульдозера был зажат между кабиной и землей.                  В 18 часов 00 минут местного времени фельдшер фельдшерско-акушерского пункта с. Зуевка Нефтегорского района констатировал смерть.  <b>Критические факторы:</b>                  Падение бульдозера.  <b>Непосредственные причины:</b>                  1. <i>Нарушение правил проведения работ руководителем.</i>                  На основании производственной инструкции по охране труда при погрузке, выгрузке и перевозке тракторной техники на трейлер ПИ-ОТР-017-2016 утверждённая Генеральным директором ООО «ГеоЛад-СТ Поволье» от 07.06.2016, водитель трейлера руководит работами по безопасному заезду и съезду техники на трейлер. Водитель трейлера не руководит работами при погрузке бульдозера на трейлер.                  2. <i>Неправильно подготовленной ТС.</i>                  На момент прибытия на трейлере отсутствовали откидные мосты.                  Дверь кабины бульдозера на момент заезда на трейлер была открыта.</p>	<p><b>Системные причины:</b>  <i>Друзья!</i>                  Бульдозер не оборудован ремнем безопасности (заводом изготовителем не предусмотрено).  <b>Извлеченные уроки:</b>                  Пренебрежение требованиями безопасности, неверная оценка риска приводит к тяжелым последствиям.  <b>Нарушены «Золотые правила безопасности труда»:</b>                  Все работы должны выполняться при соблюдении следующих условий:                  -до начала работ проведен анализ существующих опасностей и вредных факторов, разработаны, доведены до исполнителей и обеспечены необходимые меры предупреждения возможных нежелательных событий и снижения вероятности и (или) тяжести их последствий.  <b>Фотографии места происшествия:</b></p>
---	--

При аналогичных обстоятельствах произошел несчастный случай со смертельным исходом в ООО «Вела-Петролеум»  
**Причина:**  
 отсутствие сходней на трейлере,  
 машинист бульдозера не был пристегнут ремнем безопасности,  
 дверь кабины во время съезда была открыта

## Мероприятия по недопущению

1. Предоставить приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц подрядной организации.  
 Ответственный – начальник УОБР  
 Срок: до 11.08.2017
2. Инициировать применение штрафных санкций в отношении СУБР ОФ ООО «РН-Бурение».  
 Ответственный – начальник УОБР  
 Срок: до 22.08.2017

Куратор – Начальник УОБР  
 Лизунов О.Ю.



## Нарушения

1. Не санкционированный слив нефтепродуктов в шламовый амбар скважины №42 Гайдаровского месторождения

В адрес ООО «РН- Сервис» направленно требование о проведении служебного расследования и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

## Мероприятия по недопущению

1. Предоставить приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц подрядной организации.  
Ответственный – начальник УДНГ  
Срок: до 11.08.2017
2. Инициировать применение штрафных санкций в отношении ООО «РН- Сервис».  
Ответственный – начальник УДНГ  
Срок: до 22.08.2017

Куратор – Старший специалист УСТиС Исатов О. А.



# ООО «НПП-Бурение» строительство скважины 2273 Бариновско-Лебяженского месторождения



## Нарушения

1. Не санкционированный забор воды с р. Домашка

## Мероприятия по недопущению

1. Предоставить приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц подрядной организации.  
Ответственный – начальник УОБР  
Срок: до 11.08.2017
2. Инициировать применение штрафных санкций в отношении ОАО «НПП-Бурение»  
Ответственный – начальник УОБР  
Срок: до 22.08.2017

Куратор – Начальник УОБР  
Лизунов О.Ю.
