




*Послание Главы Республики Тыва Верховному Хуралу
(парламенту) Республики Тыва о положении дел в
республике и внутренней политике на 2016 год
«Сплоченность, мобилизация усилий, опора на
внутренние ресурсы»*

**Губернаторский проект
«Кыштаг для молодой семьи»**

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА «КЫШТАГ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ»

Цель



Empty rounded rectangular box for the project goal.

1

2

3

4

Empty rounded rectangular box for task 1.

Empty rounded rectangular box for task 2.

Empty rounded rectangular box for task 3.

Empty rounded rectangular box for task 4.



Задачи



Основные критерии отбора участников социального проекта

Молодая семья до 35 лет;

Супруг или супруга - незанятый житель сельского поселения
Республики Тыва;

Наличие не менее 1 ребенка;

Фактическое проживание и регистрация в сельском
поселении Республики Тыва.

Публичное обсуждение проекта

	Наименование кожууна	Председатели администраций	Ответственные за проект «Одно село - один продукт»	Кол-во поселений	Кол-во участников
1	Бай-Тайгинский	Салчак К.К.	Чульдум Э.К.	7	7
2	Баруун-Хемчикский	Салчак Ш.Д.	Бады О.О.	9	8
3	Дзун-Хемчикский	Монгуш Б.Н.	Даваа-Самбу Э.Д.	12	11
4	Каа-Хемский	Чалан-оол А.Х.	Каратаева Е. В.	11	9
5	Кызылский	Ендан В.И.	Шойгу А.А.	10	9
6	Монгун-Тайгинский	Шомбул А.С.	Монгуш М.С.	3	3
7	Овюрский	Куулар С.Д.	Достай О.С.	6	6
8	Пии-Хемский	Иусов М.В.	Абрамова А.А.	8	4
9	Сут-Хольский	Кызыл М.К.	Донгак О.Е.	7	7
10	Тандынский	Ондар С.Ч.	Килижеков Ю. А.	8	7
11	Тес-Хемский	Самдан Т.С.	Тыт-оол Ю.Д.	7	7
12	Эрзинский	Хертек О.К.	Тас-оол Л.Ш.	6	6
13	Тоджинский	Торжу В.К.	Бараан А.Т.	6	0
14	Чаа-Хольский	Сарбакай С.М.	Тамдын А.К.	4	4
15	Улуг-Хемский	Анай-оол М.К.	Бичелдей К.А.	10	9
16	Чеди-Хольский	Сагаан-оол К.Б.	Кажин-оол Р.В.	6	5
17	Тере-Хольский	Монгуш О.А.	Кыргыз Ч. С.	4	4
	Всего			124	106

Количество поселений-участников

Всего - 124 поселения

Участвуют в первый год реализации проекта - 106 поселений

Не участвуют в проекте – 18 поселений, в том числе:

Тоджинский кожуун – 6 (с. Тоора-Хем, с. Азас, с. Ий, с. Сыстыг-Хем, с. Чазылары, с. Ырбан);

Пий-Хемский кожуун – 5 (г. Туран, с. Севи, с. Сесерлиг, с. Тарлаг, с. Хадын);

Каа-Хемский – 2 (с. Сарыг-Сеп, с. Сизим);


Кызылский – 1 (п.г.т. Каа-Хем);

Дзун-Хемчикский – 1 (г. Чадан);

Улуг-Хемский – 1 (г. Шагонар);

Чеди-Хольский – 1 (с. Хову-Аксы);

Барун-Хемчикский – 1 (с. Кызыл-Мажалык).

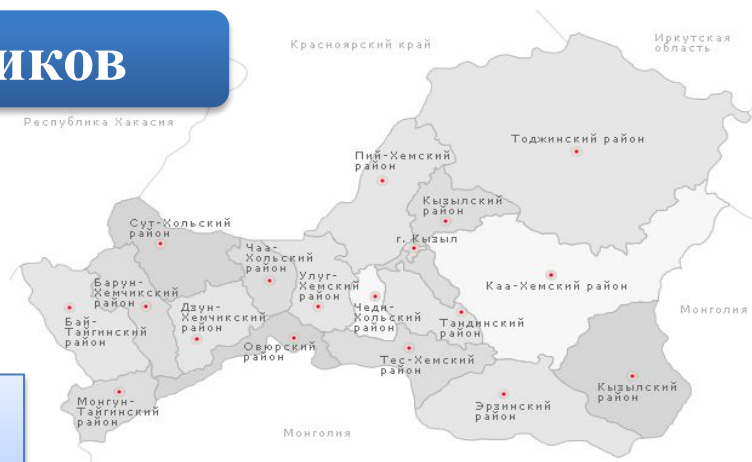

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Регистрация участника в качестве Главы КФХ - 5 дней



2. Оформление земель сельскохозяйственного назначения – 61 день

- подача заявления участниками проекта в администрацию района о предоставлении земли сельскохозяйственного назначения для ведения КФХ – 1 день;
- ↓
- проведение межевания, оценки земельного участка и постановки на кадастровый учет – 18 дней;
 - извещение в СМИ – 30 дней;
- ↓
- предоставление земельного участка в аренду, заключение договора аренды – 2 дня;
- ↓
- регистрация земельного участка в регистрационной палате – 10 дней.

ИТОГО: 2 месяца

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

3. Предоставление леса на корню участникам социального проекта в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 30.06.2009 г. №322 "Об установлении для граждан отдельной категории ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Республики Тыва»:

- *Определить лесные участки для предоставления участникам программы на льготных условиях – до 1 февраля 2016 г.;*
- *Внести изменения в постановление Правительства РТ от 30 июня 2009 г. № 322 с включением участников программы в льготную категорию граждан – до 15 февраля 2016 г.;*
- *Заклучить договора на выделения делянок леса с участниками реализации проекта, вывоз древесины – до 20 мая 2016 г.*






ИТОГО: 4 месяца

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

4. Строительство зимней стоянки с хозяйственными постройками – 60 Дней (по типовому проекту, разработанному Министерством строительства Республики Тыва)

- Осуществление контроля за ходом строительных работ на чабанских стоянках – 2 квартал 2016 г.

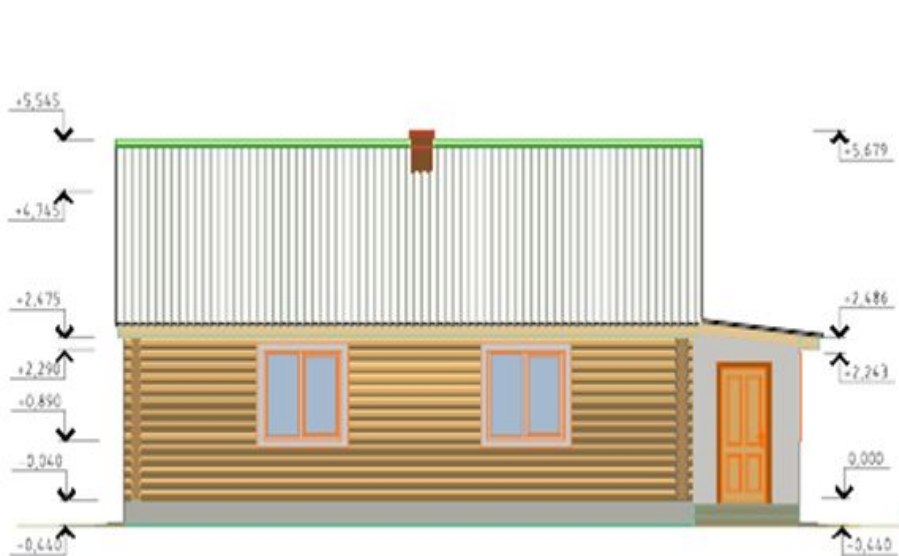

Срок окончания
строительства –
10 июля 2016 г.

Объемы основных материалов для строительства дома

Фундамент М200(В15)	12.67м3/	63цемент шт., 10.15куб песок гравий
арматура AI d12мм	246м	
AI d6мм	205м	
Стена дома		
Бревно d=200мм лиственница	19.20м3/	102шт
Перегородки		
Доски 180*40мм	0.7м3/	16шт
Стена веранды		
Брус 180*100мм	0.22м3/	2шт
Доски 180*40мм	1.2м3/	28шт
Пол		
Лаги брус 180*100мм	1.84м3/	17шт
Доски 180*40мм	3.00м3/	69шт
Перекрытия		
Брус 180*100мм лиственница	1.3м3/	14шт
Потолок		
Доски толщ 25мм	1.55м3/	57шт
Стропила		
Брус 180*100мм	0.32м3/	3шт
Доски 180*40мм	1.30м3/	30шт
Обрешетка доски 100*25мм	0.54м3/	36шт
Фронтон доски 180*25мм	0.80м3/	28шт
Карниз доски 180*25мм	0.43м3/	16шт
Кровля		
Шифер 8 волна 1750*1330мм	63шт/	100м2


Объемы основных материалов для строительства кошары

Фундамент бетон М200(В15)	28.60м ³ / 146цемент шт., 22.76куб песок гравий
Стена кошары	
Бревно d=200мм литвенница	137шт
Колонны кошары	
Бревно h=3.0м d=240мм литвенница	21шт
Бревно h=2.2м d=240мм литвенница	24шт
Бревно h=1.8м d=240мм литвенница	6шт
Перекрытия	
Брус 180*100мм лиственница	26шт
Стропила доски 180*40мм	44шт
Обрешетка доски 100*25мм	4.50м ³
Фронтон доски 180*25мм	0.80м ³ / 28шт
Сплошной настил доски 180*25мм	14.00м ³

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

5. Обеспечение альтернативными источниками электроснабжения чабанские стоянки:


- Провести анализ территорий (предоставляемых земельных участков) на предмет имеющихся ЛЭП или обеспечения альтернативными источниками электроснабжения, произвести расчеты необходимых средств – январь 2016 г.
- Объявить торги на закуп альтернативных источников электроснабжения чабанских стоянок – январь 2016 г.

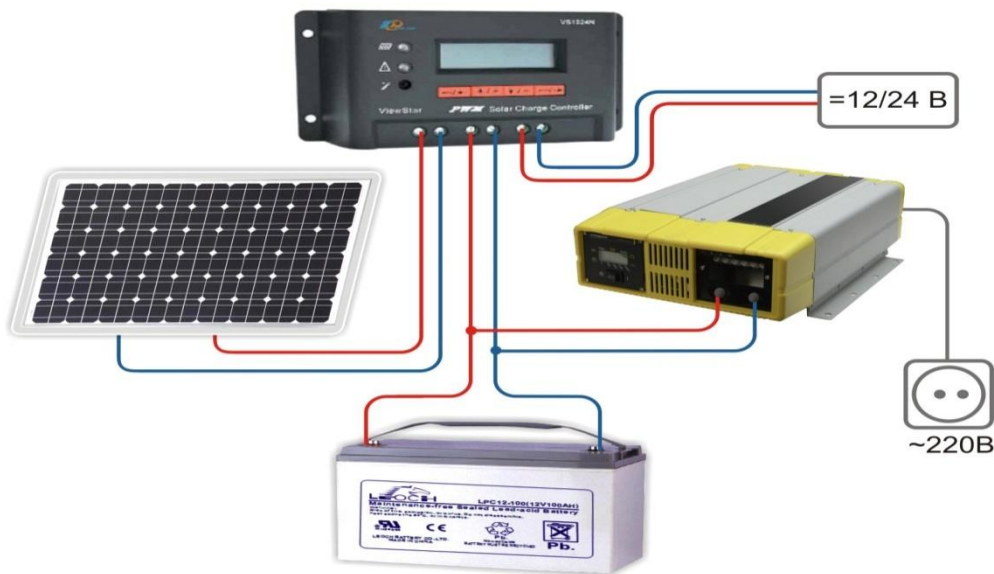

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

6. Обеспечение водозаборными скважинами чабанские стоянки:

- Провести анализ территорий (предоставляемых земельных участков) на предмет обеспечения водозаборными скважинами, произвести расчеты необходимых средств – январь 2016 г.
- Объявить торги на проведение работ по бурению водозаборных скважин на чабанских стоянках – январь 2016 г.

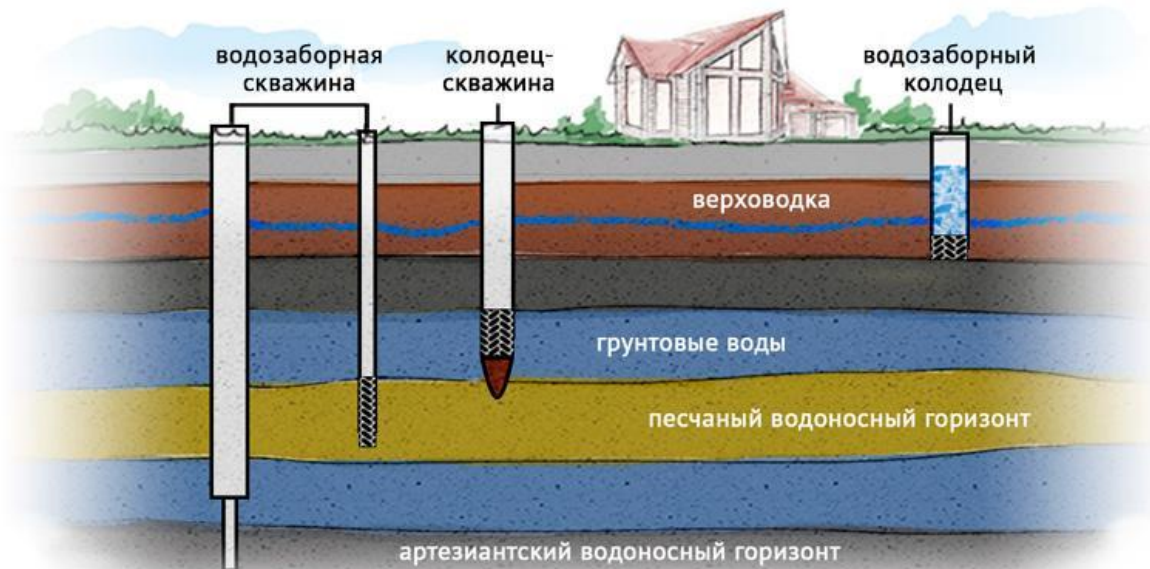

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

7. Приобретение 200 голов племенного мелкого рогатого скота на кредитные средства, полученные через ОАО «Народный банк»

- Проработать с ОАО «Народный банк» окончательную схему и условия предоставления кредитных средств для участников программы – до 1 февраля 2015 г.;



- Оказать содействие в оформлении документов на получение кредитных средств – февраль-апрель 2016 г.;



- Обеспечить заключение Соглашений с участниками проекта на предоставление государственной поддержки по выданным кредитам - май-июнь 2016 г.

Народный Банк
Республики Тыва



предоставление
кредитных средств
до 15 июня 2016 года



Схема кредитования в рамках реализации проекта



Ресурсное обеспечение социального проекта

	мероприятие	Ответственные
Постановление Правительства РТ от 30 июня 2009 г. № 322 «Об установлении для граждан отдельной категории ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории Республики Тыва»	предоставления леса на корню участникам социального проекта	Государственный комитет по лесному РТ, Органы местного самоуправления РТ
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы»	Строительство зимней стоянки «Кыштаг» с хозяйственными постройками, обеспечение водоснабжения, альтернативными источниками электроснабжения	Минсельхозпрод РТ, Минстрой РТ, Минтопэнерго РТ, Органы местного самоуправления РТ
Потребительский кредит	предоставление кредитных средств на приобретение племенного скота	ОАО «Народный банк», Минсельхозпрод РТ

Экономический эффект от реализации проекта «Кыштаг-молодым семьям»

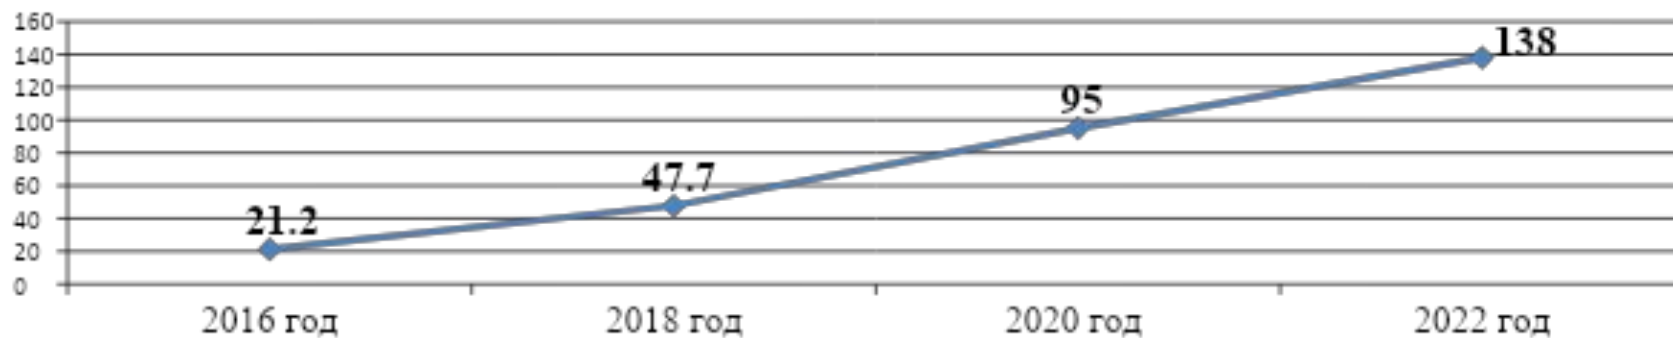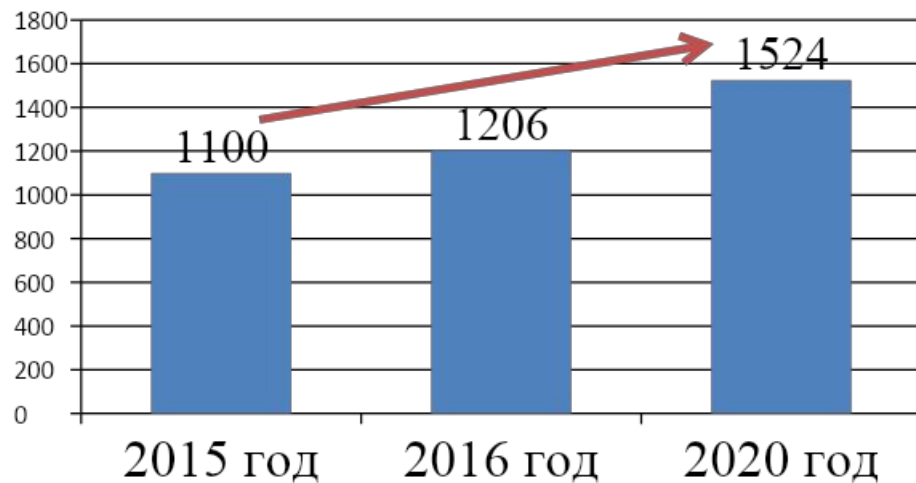

Благодарю за внимание!
