

Учебный курс

Управление внедрением информационных систем

Лекция 5

Управление содержанием

Лектор

к.т.н, доцент, заведующий кафедрой проектирования и внедрения
информационных систем факультета "Бизнес-информатика"
Государственного университета - Высшая школа экономики

Грекул Владимир Иванович

Управление содержанием
проекта
Project Scope Management

Процессы управления содержанием

- ❑ **Инициация** – авторизация проекта или его фазы:
выделение ресурсов, назначение МП
- ❑ **Планирование содержания** – определение
документирование содержания
- ❑ **Уточнение содержания** – декомпозиция целей
и работ проекта
- ❑ **Подтверждение содержания** – формальное
принятие содержания проекта заинтересованными
сторонами
- ❑ **Контроль изменений содержания** –
контроль и координация вносимых в содержание
изменений

Определения

Управление содержанием проекта – процессы, обеспечивающие наличие в проекте **всех и только тех** видов деятельности, которые необходимы для успешного завершения проекта.

Содержание проекта – работа, которую необходимо выполнить для получения нужного продукта.

Содержание продукта – требуемые характеристики продукта.

Процесс «инициация»

- *Описание продукта*
- *Стратегический план*
- *Критерии выбора проекта*
- *Историческая информация*

- *Методы выбора проекта*
- *Экспертная оценка*

- *Устав проекта (Project Charter)*
- *Назначение МП*
- *Ограничения*
- *Предположения*


Подготовка и утверждение устава проекта

Устав проекта – основные разделы (*Project Charter*)


- ❑ описание бизнес-потребностей, вызвавших появление проекта
- ❑ предварительное описание продукта проекта
- ❑ краткое описание содержания проекта
- ❑ границы проекта; что не входит в содержание проекта
- ❑ основные действующие лица проекта: МП, спонсор, заказчик
- ❑ сроки разработки уточненного содержания и плана проекта

Этапы инициации проекта

Внутренние проекты




Устав проекта




План проекта

*Анализ
осуществимости*



Исполнение проекта

Внешние проекты

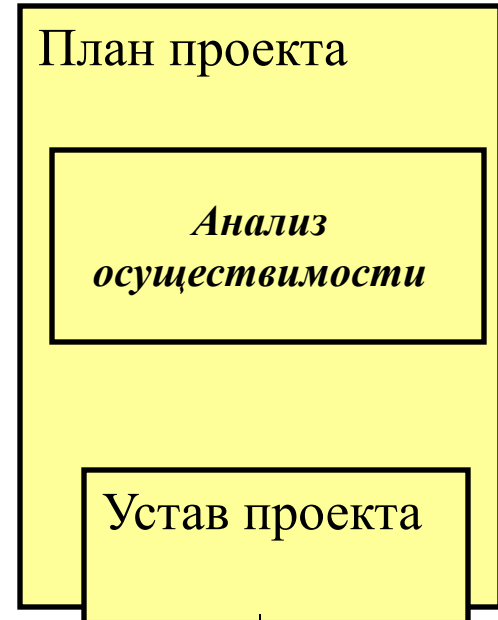


План проекта

*Анализ
осуществимости*

Устав проекта



МП назначен и наделен полномочиями



Исполнение проекта

Процесс «планирование содержания»

- *Описание продукта*
- *Устав проекта*
- *Ограничения*
- *Предположения*


- *Анализ продукта*
- *Определение альтернатив*
- *Анализ выгод и затрат*
- *Экспертная оценка*

- *Содержание проекта (цели и задачи) (Scope statement)*
- *Сопутствующие материалы*
- *План управления содержанием*

Последовательная разработка и документирование основных видов работ, необходимых для создания продукта

Основной результат -

документ, констатирующий цели, задачи и результаты проекта
(*Scope statement, «Определение проекта», «Цели и задачи проекта»*)

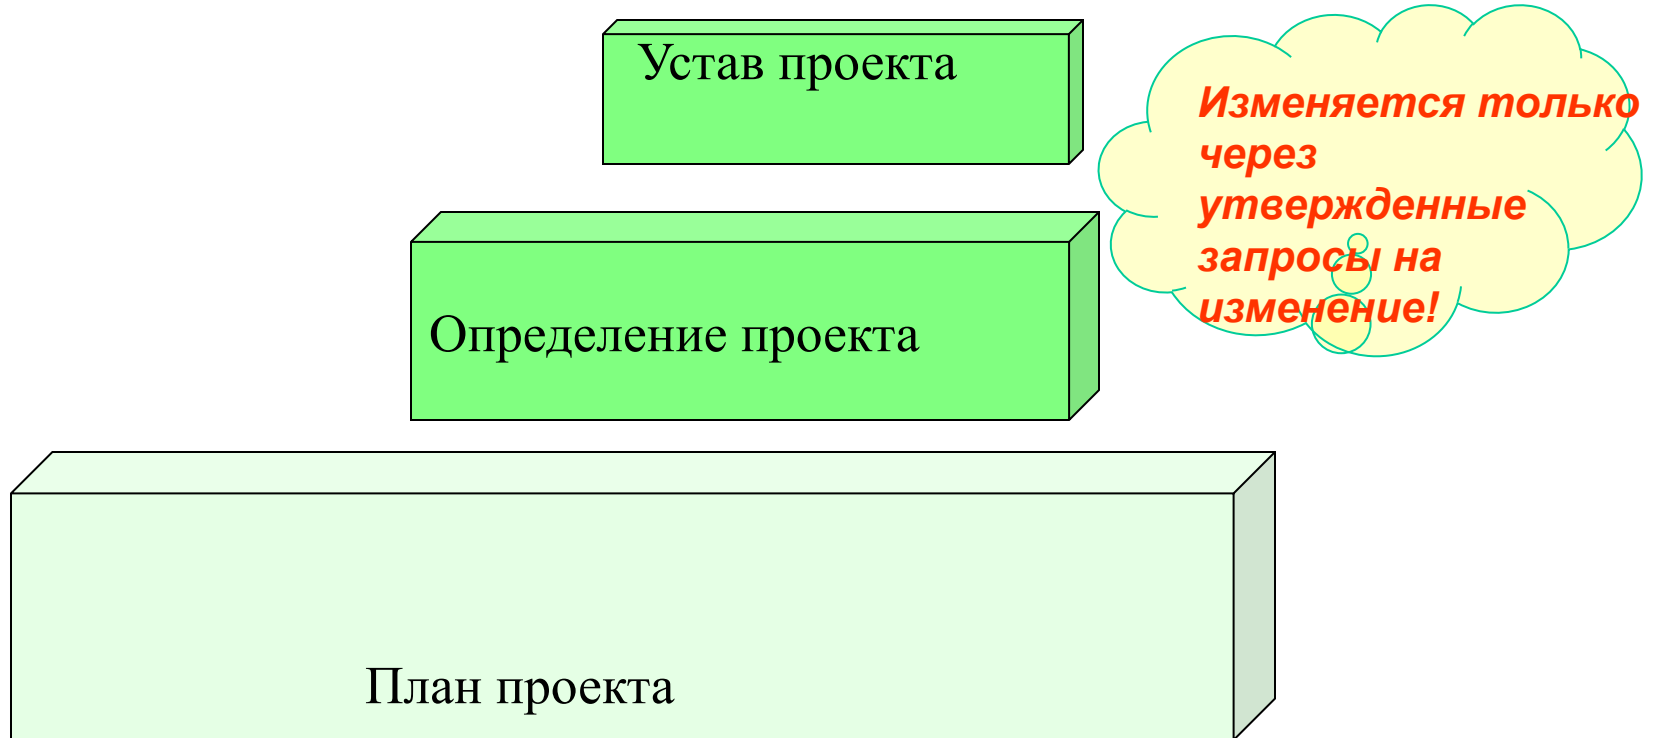

Определение проекта – основные разделы (*Scope statement*)

- ❑ **обоснование проекта** – описание бизнес-задач и потребностей, вызвавших появление проекта
- ❑ **описание продукта проекта**
- ❑ **основные результаты проекта** – измеримые и проверяемые результаты, достижение которых означает завершение проекта
- ❑ **цели и критерии их достижения** – измеримые, проверяемые, одинаково понимаемые всеми сторонами проекта
- ❑ **границы проекта** - что не входит в содержание проекта
- ❑ **стратегический подход к исполнению проекта** – может быть отдельным документом

План управления содержанием – основные вопросы

- ❑ как будет отслеживаться содержание проекта – оформление работ, планов и бюджетов по задачам; мониторинг результатов работ МП совместно с функциональными лидерами; мониторинг отклонений от планов и бюджетов МП совместно с функциональными лидерами;
- ❑ как будут инициироваться и кем будут утверждаться изменения содержания проекта
- ❑ порядок документирования изменения содержания

Процесс «уточнение содержания»

- *Определение проекта*
- *Ограничения*
- *Предположения*
- *Другие планы*
- *Историческая информация*

- *Шаблоны ИСР*
- *Декомпозиция*

- *ИСПИСР (WBS)*
- *Изменения содержания проекта*

Уточнение содержания путем разбиения на более мелкие и управляемые части.

Формирование ИСР (WBS – Work Breakdown Structure)

Цель:


- повышение точности оценок по стоимости, времени, ресурсам
- создание базиса для измерения и контроля хода выполнения проекта
- задание четкого распределения ответственности

ИСР\ИСП разрабатывается путем разумного сочетания иерархической структуры продукта с процессом его создания:


- продукт разбивается на подсистемы и элементы*
- каждому элементу сопоставляется функциональная задача, в процессе которой он создается*
- функциональные задачи делятся на пакеты и операции*

Результат критически важен для всего проекта!

ИСП разработки информационной системы

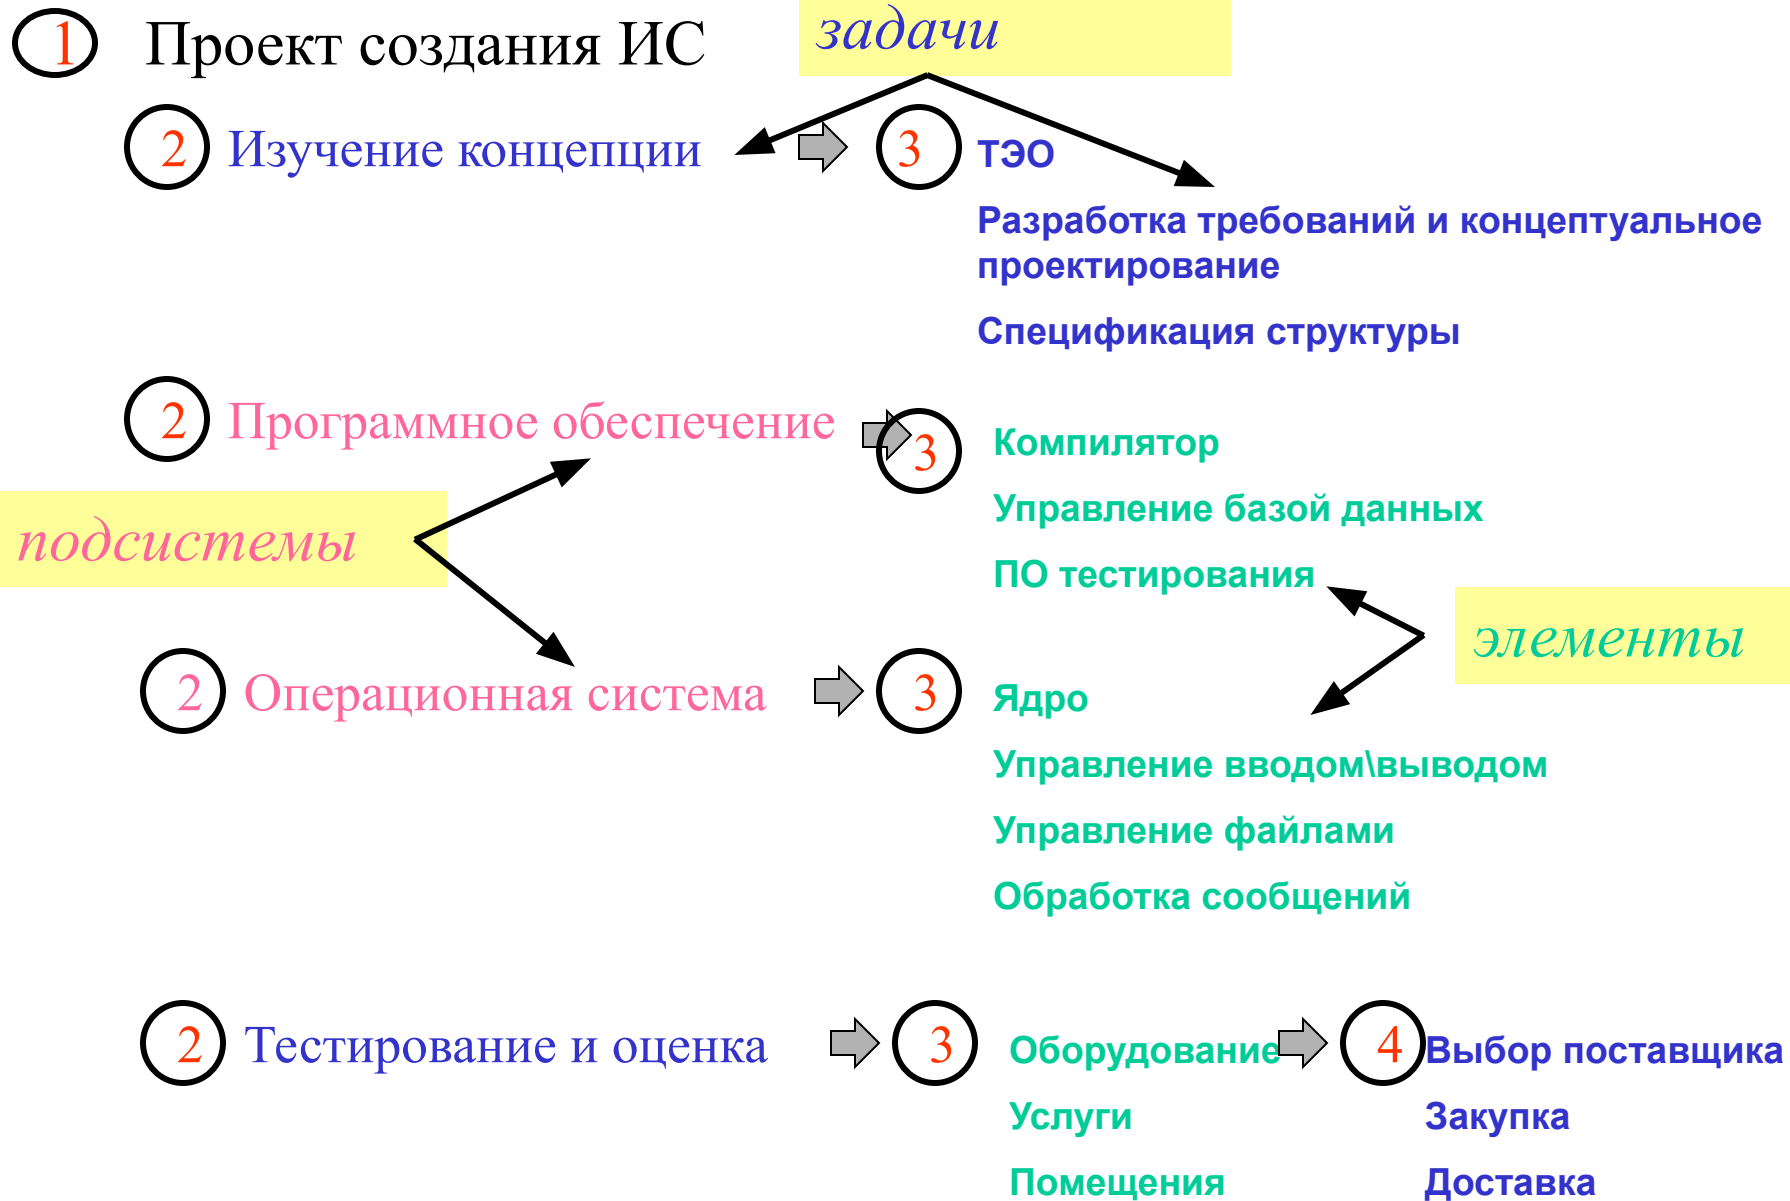

Отображение ИСП/ИСР в диаграмме Гантта

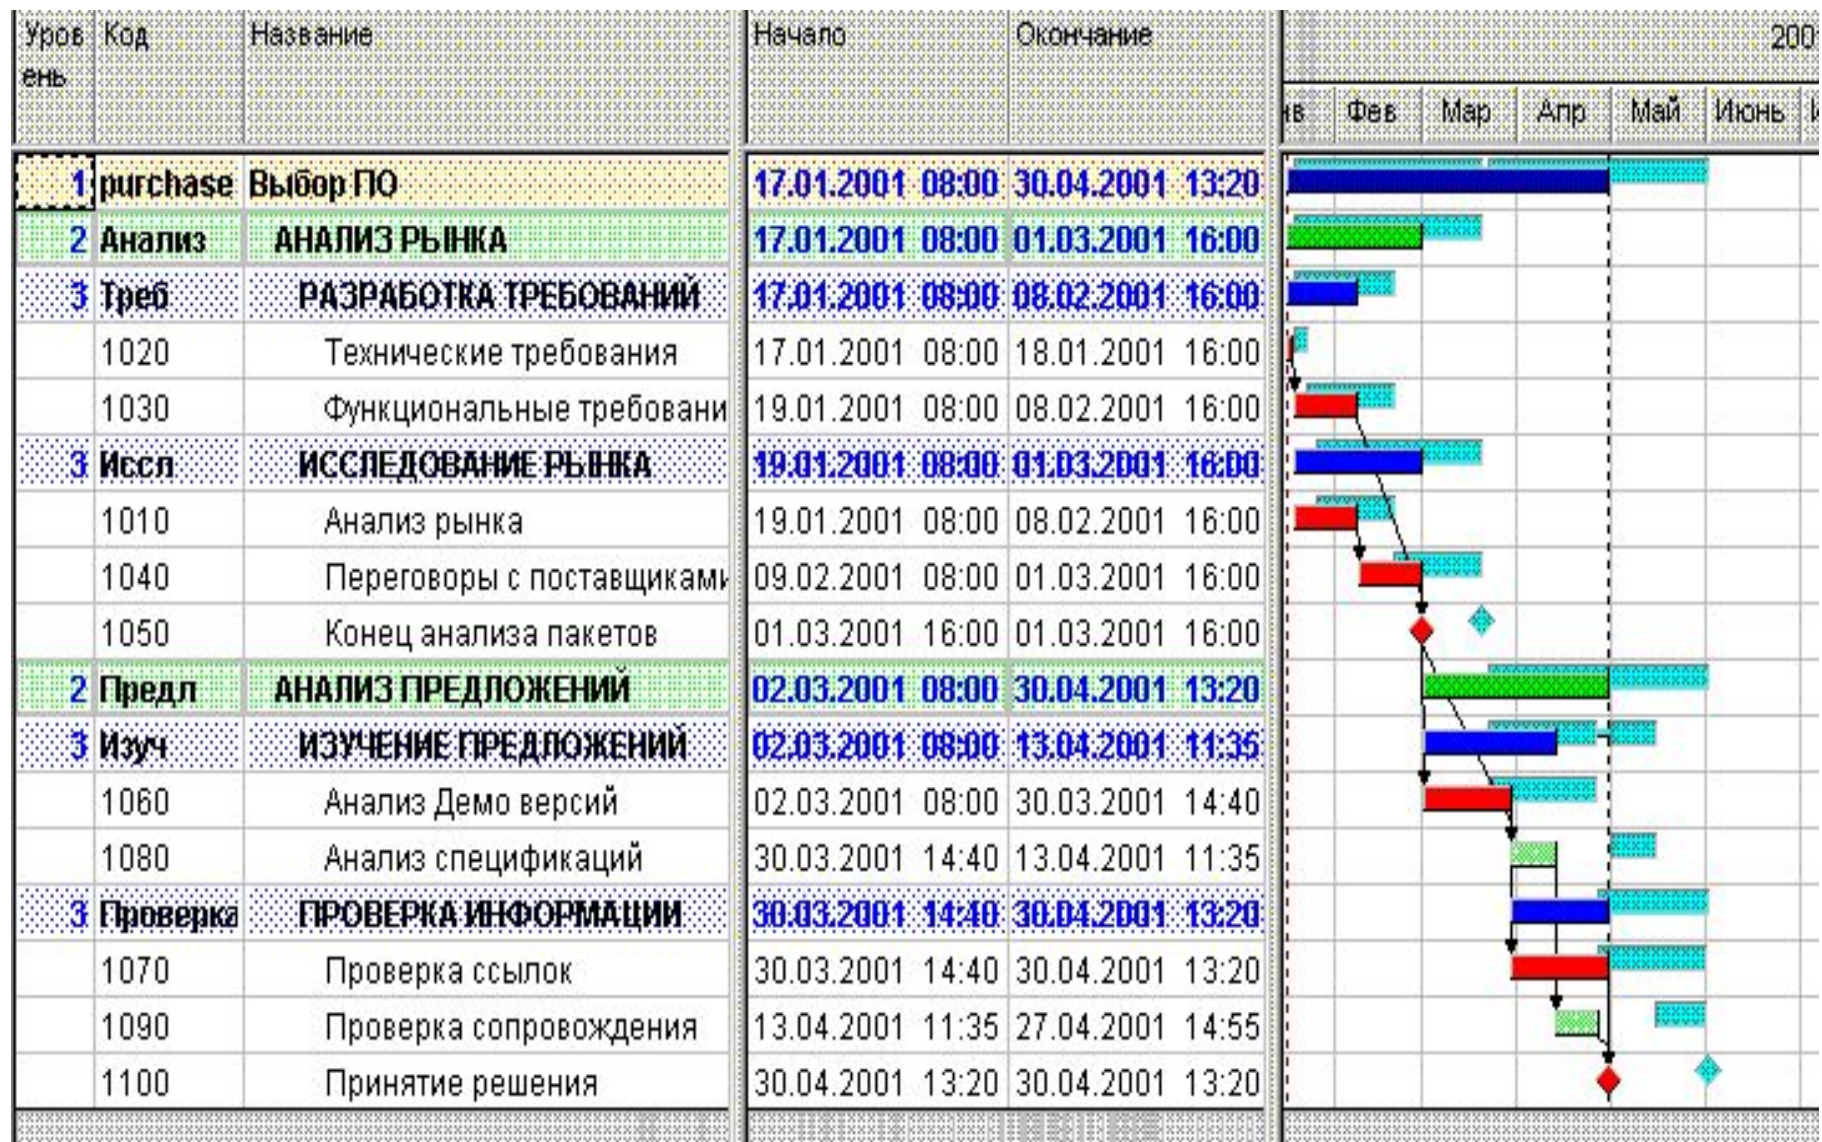

Декомпозиция оканчивается

когда:

- становится возможной реалистическая оценка сроков, стоимости , рисков
- элемент не может быть разбит дальше логически
- элемент может быть выполнен относительно быстро (за 80 часов)

Каждому элементу ИСП присваивается уникальный код, который заносится в справочник ИСП.

Работы, не включенные в ИСП, не являются работами проекта!

Специальные виды элементов ИСП

Событие – это результат, достигнутый в определенный момент времени, означающий начало или завершение одной либо нескольких задач (операций).

Контрольное событие – определяет значительное достижение в рамках проекта.

Интерфейсное событие – определяет изменение ответственности или области взаимодействия элементов ИСП.

События необходимо идентифицировать, запланировать и проконтролировать!

Задание событий в диаграмме Гантта

Операция "Принятие решения" (код: 1100) [?] [X]

| Материалы | Стоимостные составляющие | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Производство ресурсов | Комментарий | OLE-документы и папка |
| Исходные данные | Расчётные данные | Связи |
| | | Назначения |

Название:

Код: Начало (НПЧ):

Краткое название: Окончание (НПЧ):

Объем: Единица объёма:

Приоритет: Начало (факт):

Тип: Окончание (факт):

Длительность (часы): Длительность (дни):


Общая длит-ть команд (часы): Общая длит-ть команд (дни):

Календарь:


Прерываемая

Тип ДПГ:

- Длительность
- Производительность
- Гамак
- Контрольное событие



Процесс «подтверждение содержания»

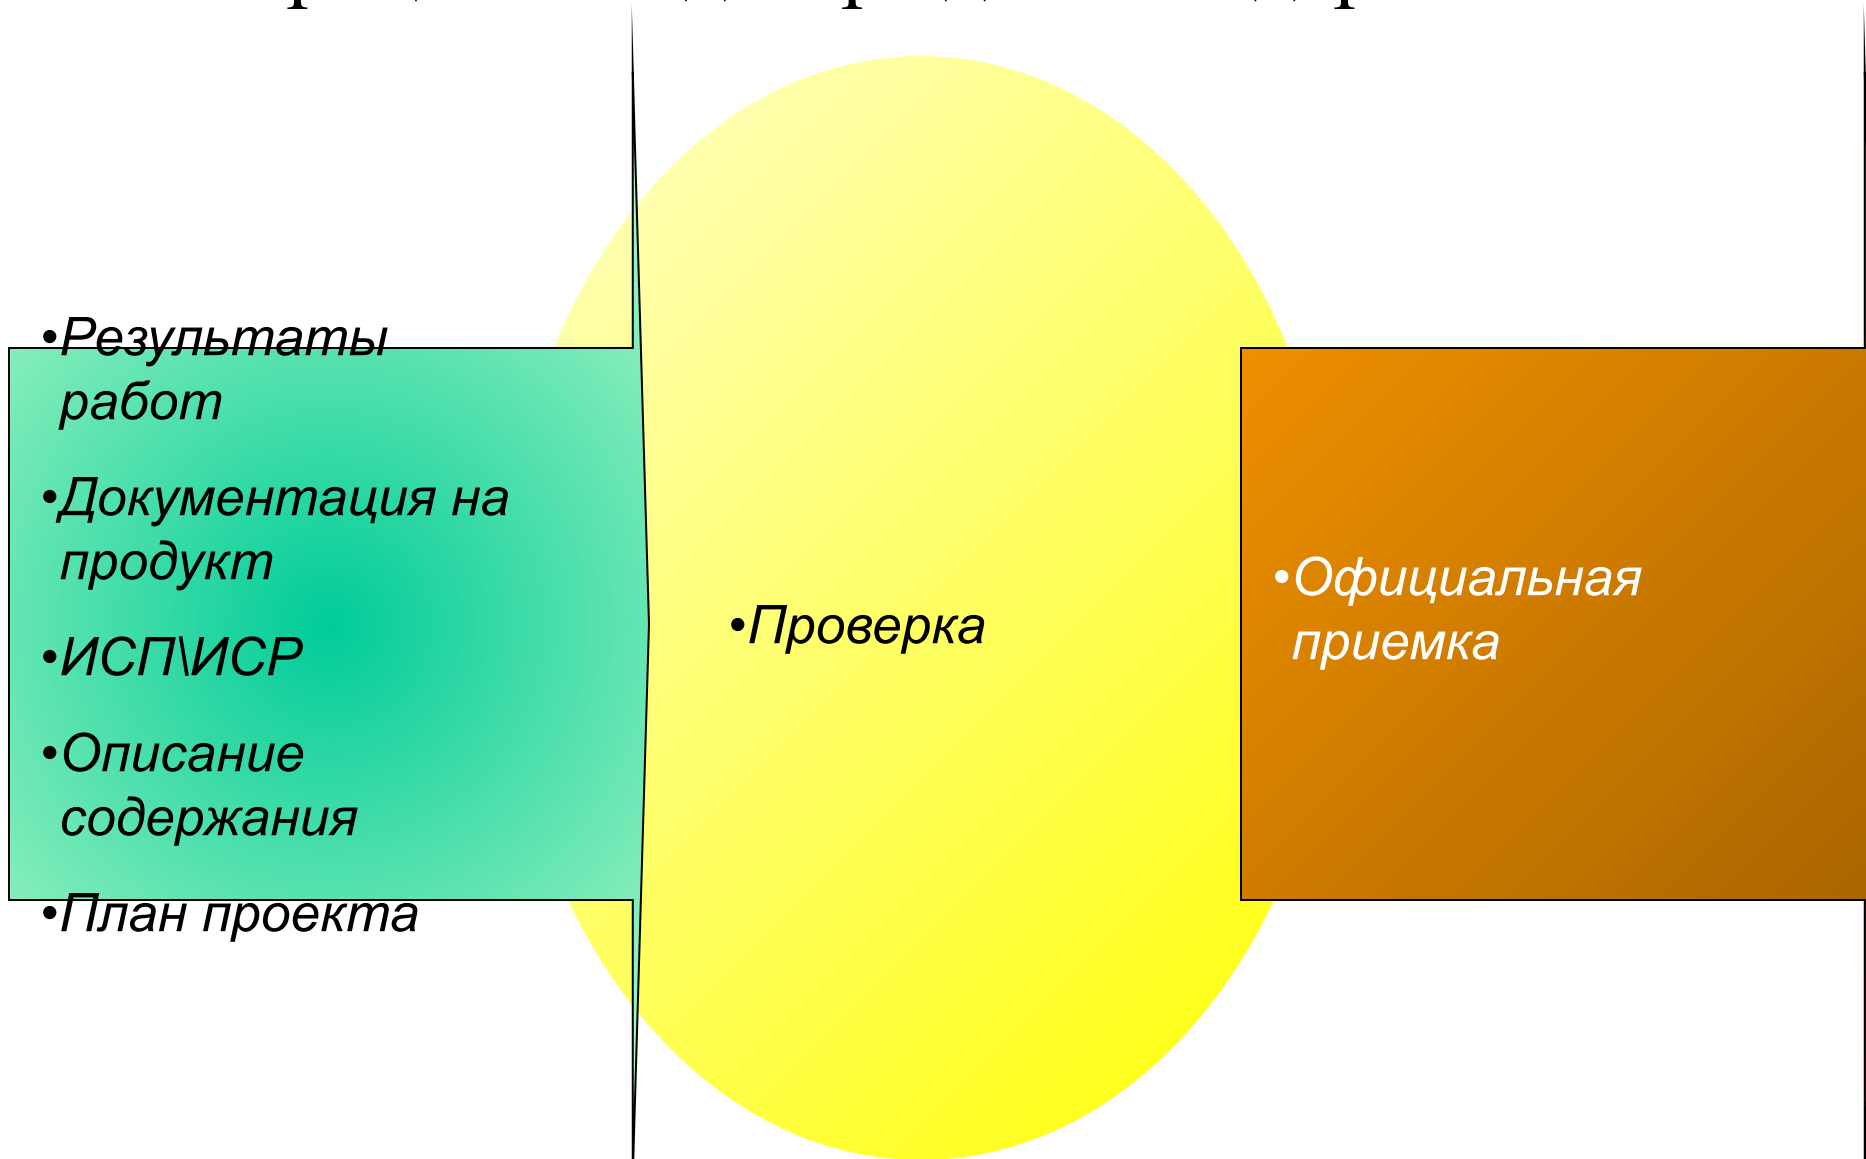

Официальное принятие участниками результатов работ по проекту.

Процесс «контроль изменения содержания»

• ИСПИСПР

- Отчеты о ходе выполнения работ
- Запросы на изменение содержания
- План управления содержанием

- Процедуры управления изменениями содержания
- Измерение хода выполнения проекта
- Дополнительное планирование

- Дополнительный план содержания проекта
- Корректирующие воздействия
- Извлеченные уроки
- Изменения базового плана

Является частью интегрированного контроля изменений в проекте

Причины изменения содержания проекта

- ❑ изменения во внешней среде (изменение законодательства)
- ❑ ошибки или упущения при описании содержания продукта или проекта
- ❑ появление новых технологий, позволяющих сократить затраты времени и средств на проект
- ❑ изменения бизнес-потребностей
- ❑ наступление непредвиденных или незапланированных рисков
